



Контрольно-счетная палата
Нижегородской области

Мониторинг хода реализации региональных проектов Нижегородской области по итогам 2020 года

Информация о показателях и их выполнении приводится по данным размещенных в системе Электронный бюджет отчетов о ходе реализации региональных проектов Нижегородской области на 2020 год (по состоянию на 19.05.2021 в статусе «утверждено») с учетом информации регионального проектного офиса о дополнительных соглашениях к Соглашениям о реализации региональных проектов, корректирующих показатели региональных проектов на 2020 год и не нашедших отражения в системе Электронный бюджет

Национальные / региональные проекты Нижегородской области

2019-2024 годы

12
национальных проектов РФ*

национальные проекты	кол-во региональных проектов		
	2019 год	2020 год	2021 год
Демография	5	5	5
Здравоохранение	7	7	7
Образование	7	7	6
Жилье и городская среда	3	3	4
Экология	6	6	5
Безопасные и качественные автомобильные дороги	3	3	3
Производительность труда и поддержка занятости	3	3	2
Цифровая экономика	5	5	5
Культура	3	3	3
Малое и среднее предпринимательство...	5	5	3
Международная кооперация и экспорт	4	3	2
Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	1	1	-

до 2024 года
226
показателей
достижения
результатов**

45
региональных
проектов**

** - по данным размещенных в системе Электронный бюджет паспортов региональных проектов по состоянию на 28.05.2021

2020 год

12
национальных проектов РФ

51
региональный
проект

238
показателей
достижения
результатов

областным бюджетом на 2020 год


предусмотрено
33,0 млрд.рублей

профинансировано
31,5 млрд.рублей

* - реализация национального проекта «Наука» не требует разработки региональных проектов

Структура финансирования национальных проектов в Нижегородской области в 2020 году

Расходы на реализацию национальных проектов в Нижегородской области в 2020 году
– 14,1% расходов областного бюджета

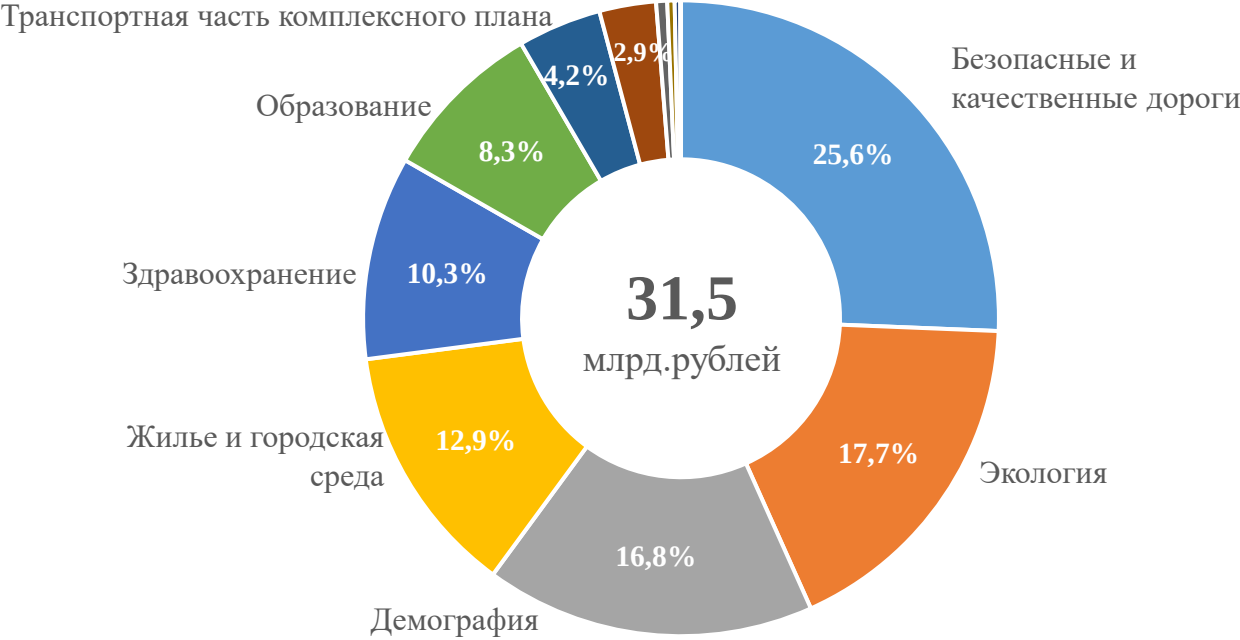


Национальный проект	факт 2020 года	
	млн.рублей	доля, %
Безопасные и качественные дороги	8 086,6	25,6%
Экология	5 569,7	17,7%
Демография	5 290,7	16,8%
Жилье и городская среда	4 056,8	12,9%
Здравоохранение	3 261,4	10,3%
Образование	2 626,0	8,3%
Транспортная часть комплексного плана	1 342,4	4,2%
Малое и среднее предпринимательство	908,6	2,9%
Культура	177,0	0,6%
Цифровая экономика	118,0	0,4%
Производительность труда и поддержка занятости	88,9	0,3%
Международная кооперация и экспорт	11,7	0,04%
ИТОГО	31 537,8	100%

Исполнение в разрезе региональных составляющих национальных проектов в 2020 году


национальный проект



исполнение плановых годовых назначений областного бюджета - **95,5%**

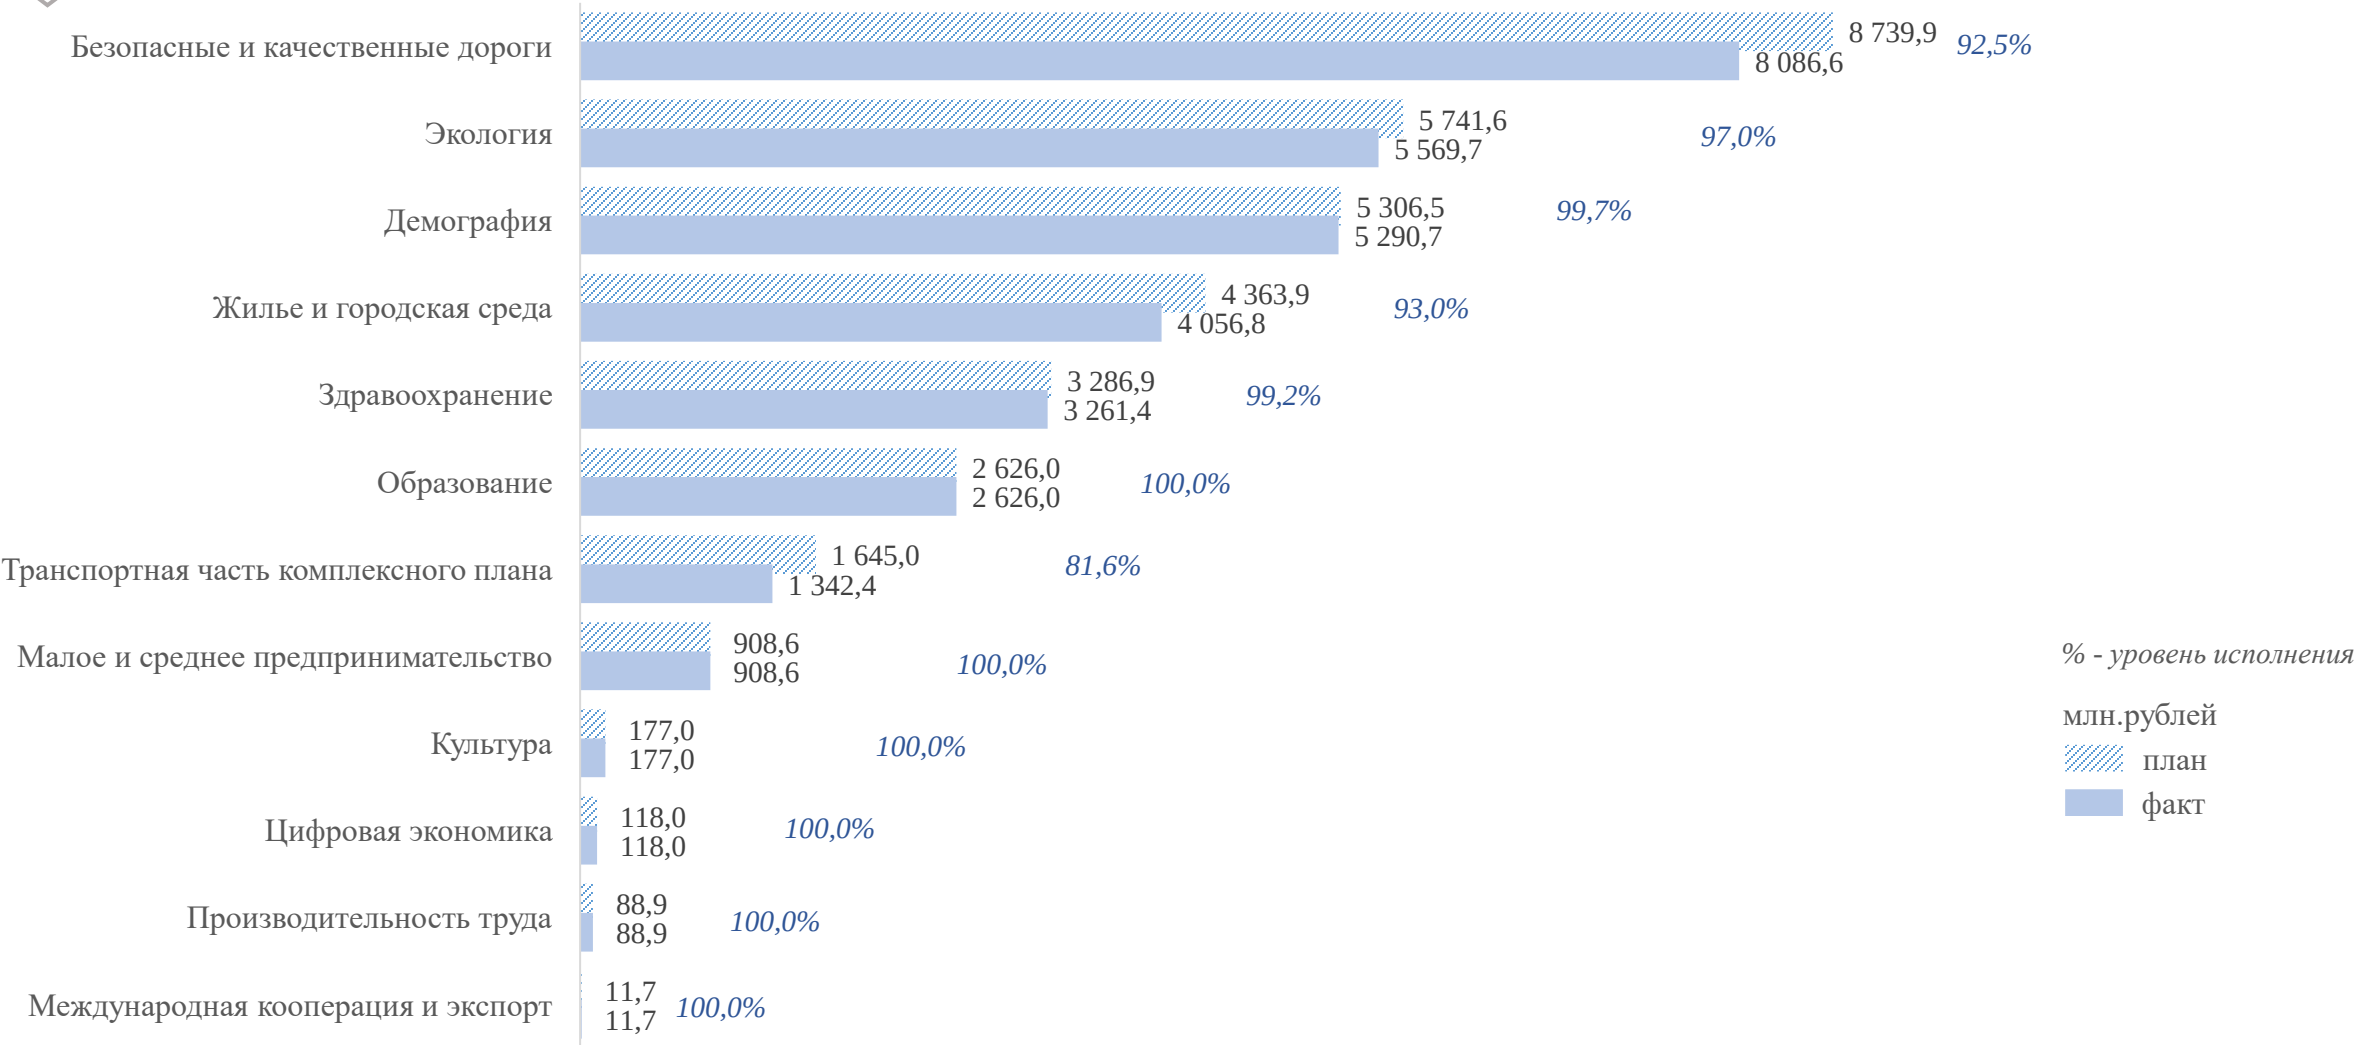

Исполнение региональных проектов в разрезе видов расходов в 2020 году

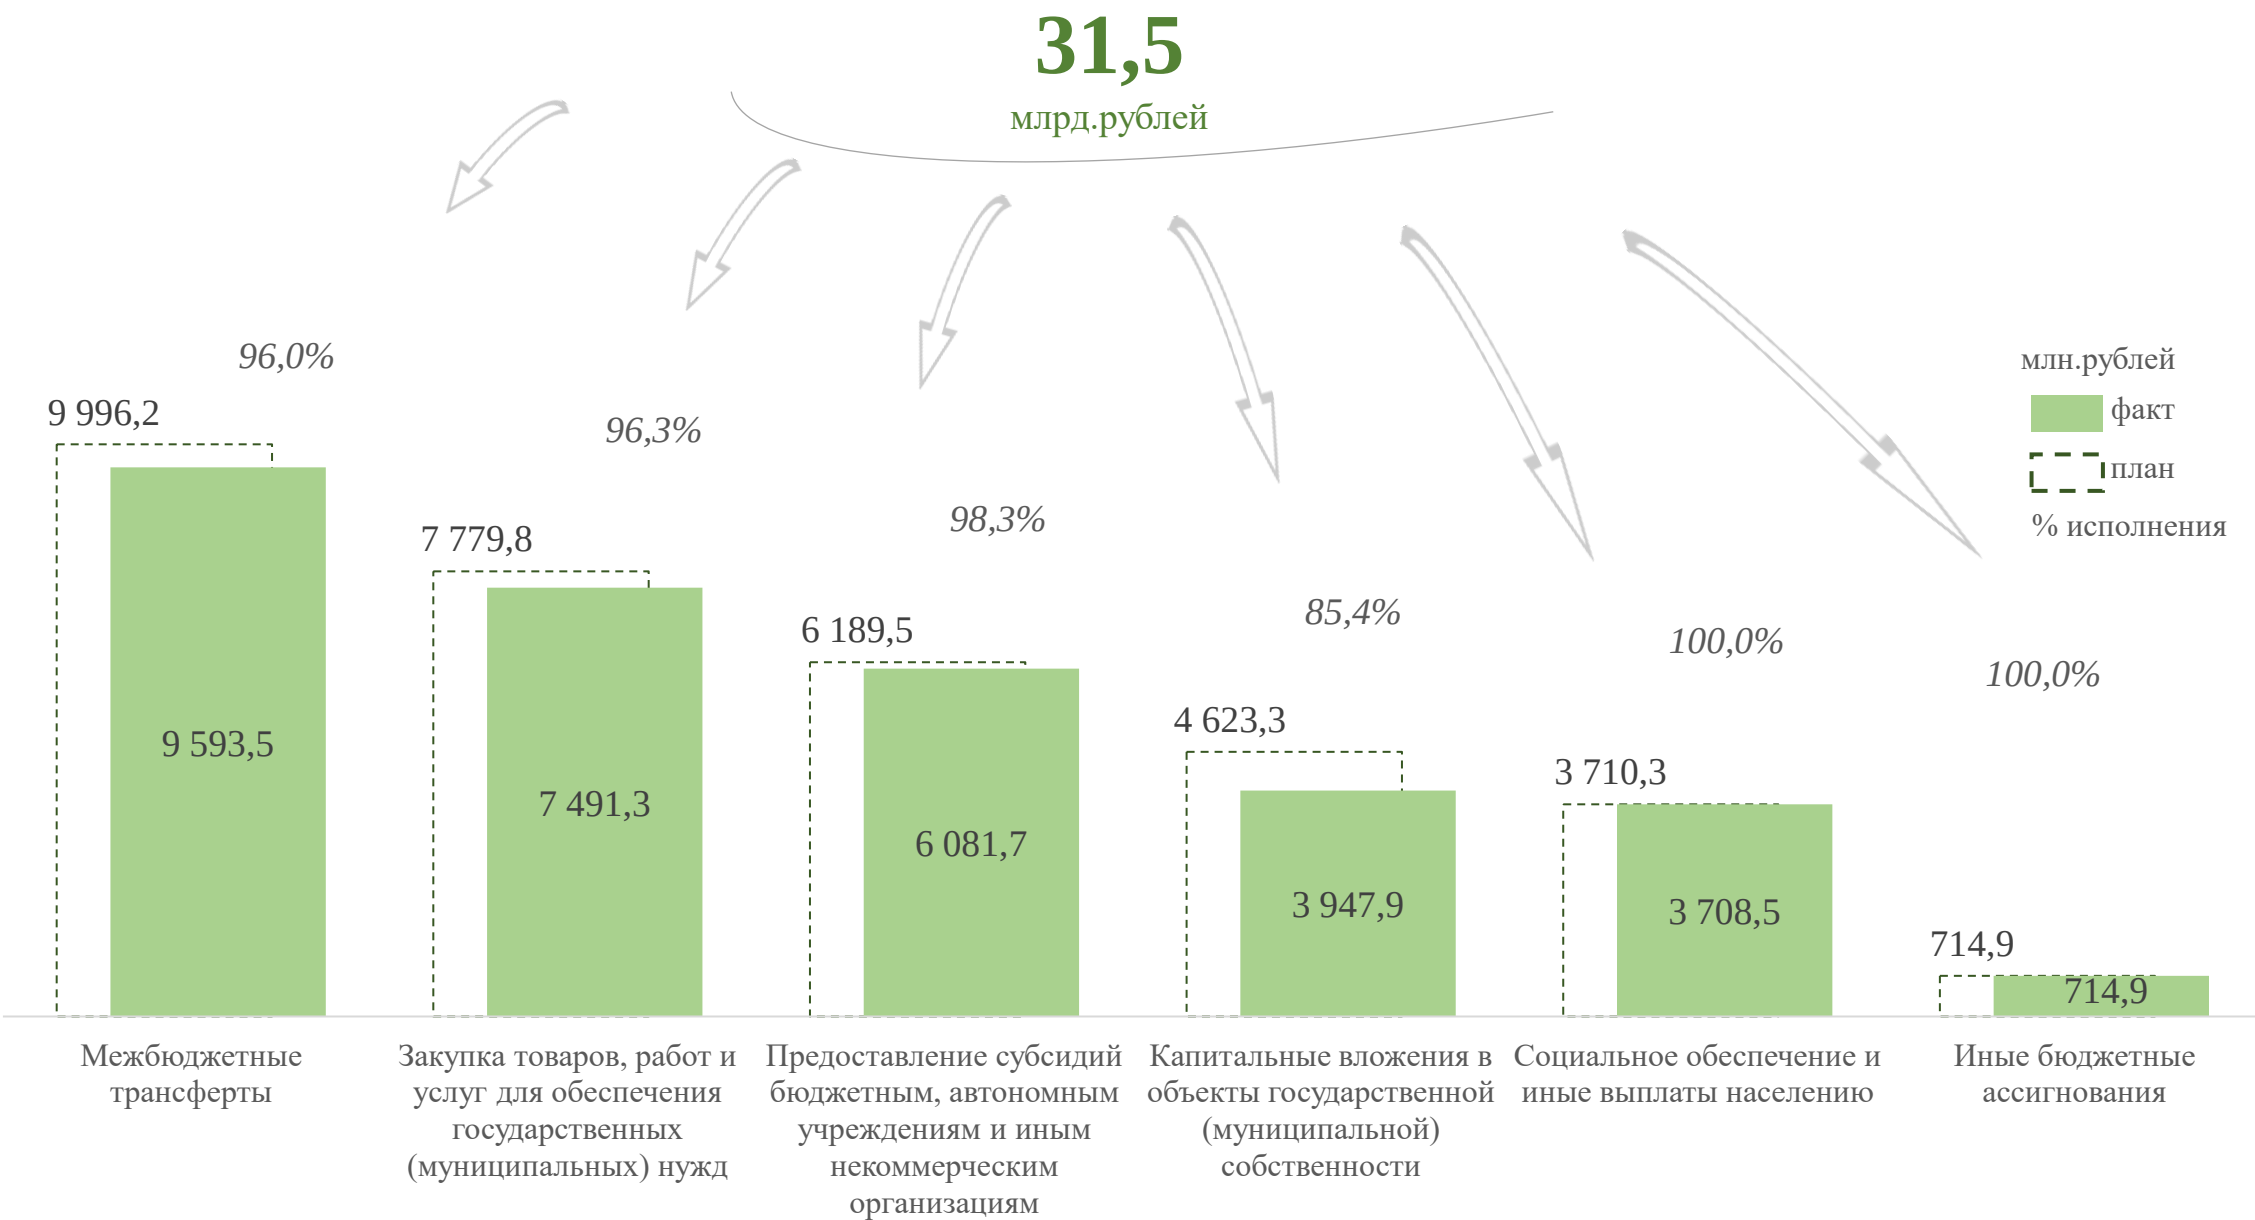


Цели и показатели региональных проектов. Выполнение в 2020 году

Национальный проект	Региональные проекты		Показатели региональных проектов, шт.			
	всего, шт.	в т.ч. не финансировались в 2020 году, шт.	в т.ч. на 2020 год кол-во показателей не равных нулю, шт.		исполнены с отклонениями	
			всего	в т.ч. по проектам, которые не финансировались	кол-во, шт.	доля, %
Демография	5	1	27	6	18	66,7%
Здравоохранение	7	2	63	7	24	38,1%
Образование	7	-	26	-	3	11,5%
Жилье и городская среда	3	-	19	-	4	21,1%
Экология	6	-	18	-	5	27,8%
Безопасные и качественные автомобильные дороги	3	-	7	-	1	14,3%
Производительность труда и поддержка занятости	3	1	15	2	2	13,3%
Культура	3	-	7	-	1	14,3%
Малое и среднее предпринимательство...	5	1	14	2	1	7,1%
Транспортная часть комплексного плана	1	-	-	-	-	-
Цифровая экономика	5	2	14	4	2	14,3%
Международная кооперация и экспорт	3	2	14	7	2	14,3%
ИТОГО	51	9	224	28	63	28,1%

В 2020 году не осуществлялось финансирование 9 региональных проектов, в составе 6 национальных проектов.
Из 28 показателей, установленных по указанным региональным проектам, 11 по итогам года исполнены с отклонениями.

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 99,7%

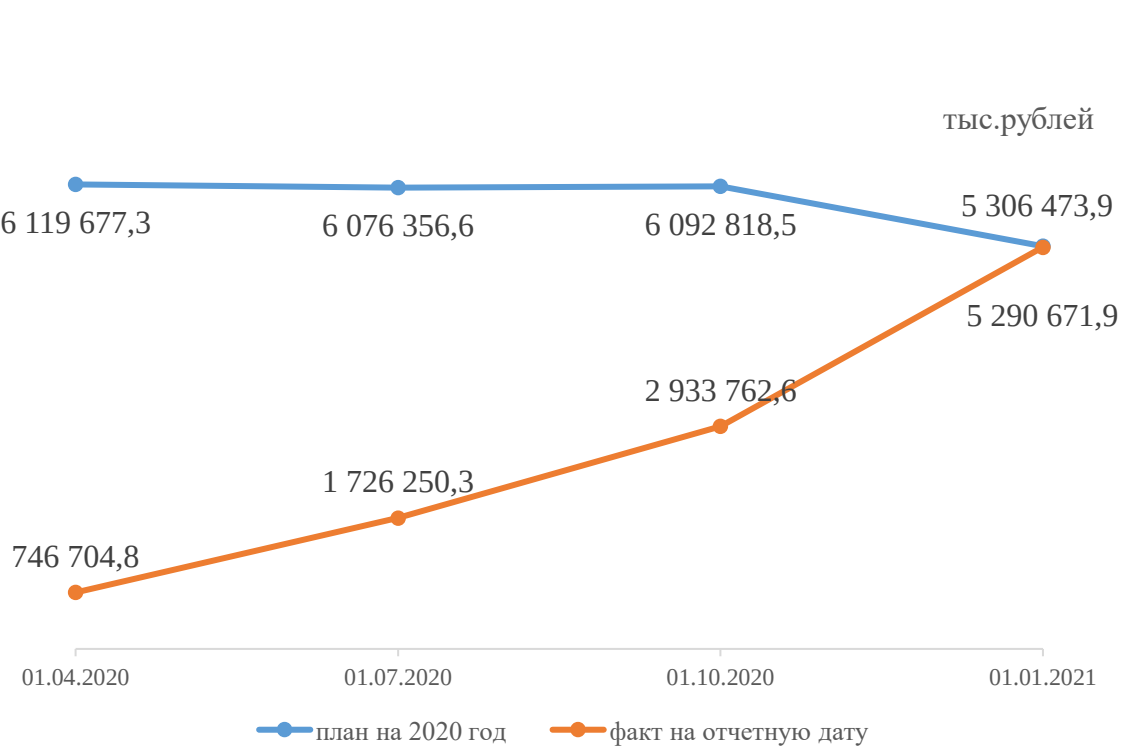


Структура финансирования в разрезе региональных проектов




Региональный проект
Финансовая поддержка семей при рождении детей


Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД*




Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД*




Коэффициенты рождаемости в возрасте 35-39 лет, ЕД*




Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, ЕД*



Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ЕД*



Суммарный коэффициент рождаемости, ЕД*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет


Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %*




Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел.*

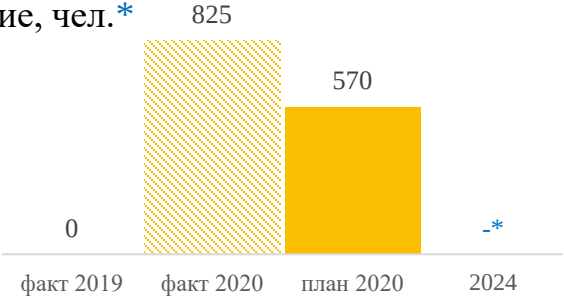


Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %

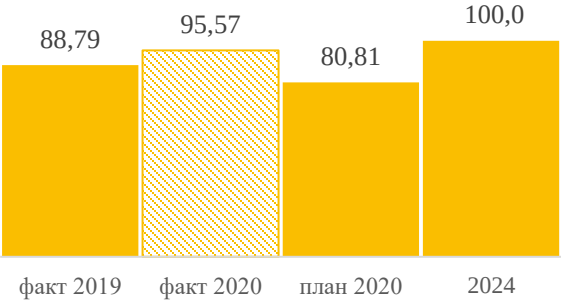

Численность воспитанников в возрасте до 3х лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, ЧЕЛ*



Численность воспитанников в возрасте до 3х лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, ЧЕЛ*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Старшее поколение (Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»)


Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, ЕД*




Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, УСЛ.ЕД




Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %



Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %



Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел. *




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек


Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта




Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек*




Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек*




Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола, ГОД*



Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс.человек*



Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья, млн.человек*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Региональный проект


Спорт - норма жизни

(Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом, массовым спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва «Спорт - норма жизни»)


Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %*




Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %*

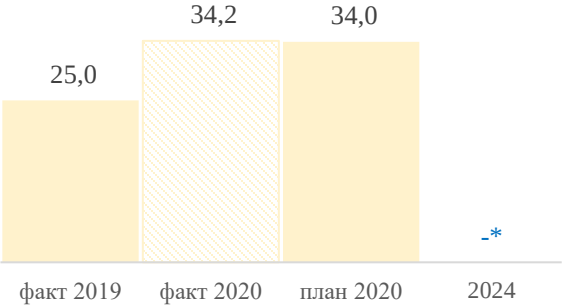


Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %*



Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %

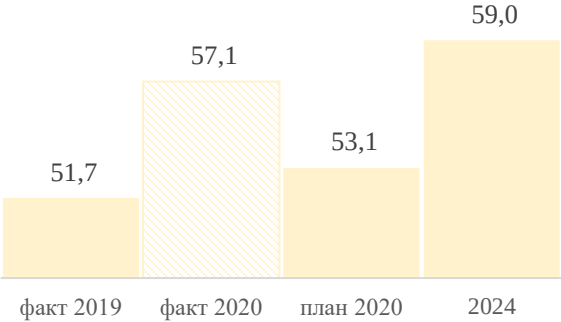


Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %*



* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 99,2%

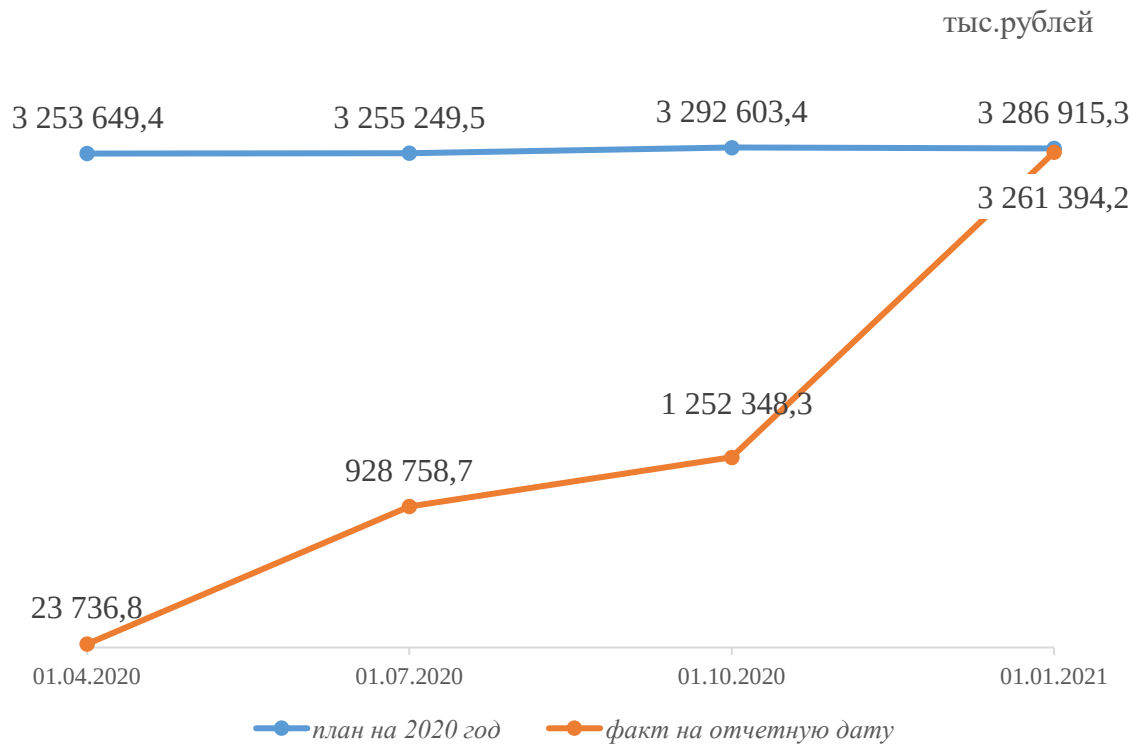


Структура финансирования в разрезе региональных проектов

тыс.рублей		региональные проекты	2020		% исполнения
план	факт		план	факт	
3 286 915,3	3 261 394,2				
38%	38%	Борьба с онкологическими заболеваниями	1 252 536,8	1 244 809,5	99,4%
		Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ	962 390,4	947 419,7	98,4%
		Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	677 017,7	676 758,1	100,0%
29%	29%	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	242 302,2	241 300,8	99,6%
		Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	152 668,2	151 106,1	99,0%
21%	21%	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	финансирование не предусмотрено		
7%	7%	Развитие экспорта медицинских услуг	финансирование не предусмотрено		
5%	5%				
план	факт				


Региональный проект

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи


Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн.чел.*




Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при диспансеризации и профилактическом мед.осмотре у взрослого населения, %*




Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.*




Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %*




Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %*




Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС, первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховыми представителем), %*




Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)



Количество посещений при выездах мобильных бригад, тыс. посещений*



Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных к которым совершены вылеты, %



* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен


Региональная составляющая национального проекта Здравоохранение.

Целевые показатели. 2020 год


Региональный проект

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями


Смертности от инфаркта миокарда, чел. на 100 тыс.населения*




Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, чел. на 100 тыс. населения*




Больничная летальность от инфаркта миокарда, %




Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %




Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %*



Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс.ед




Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Региональный проект Борьба с онкологическими заболеваниями


Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %



Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %




Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %



Региональный проект Развитие экспорта медицинских услуг


Количество пролеченных иностранных граждан, тыс.чел.




Региональный проект

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям


Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей), промилле




Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)




Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %







Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле



Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста




Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни:

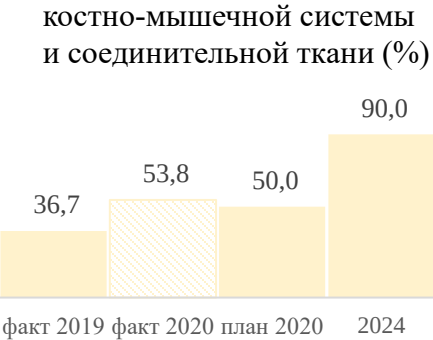

Региональный проект

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами


Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тысяч населения




Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %



Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тысяч населения




Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс.чел




Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях):

врачами, % нарастающим итогом



средними медицинскими работниками, % нарастающим итогом




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)


Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс.чел.




Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %




Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций области, чел.*

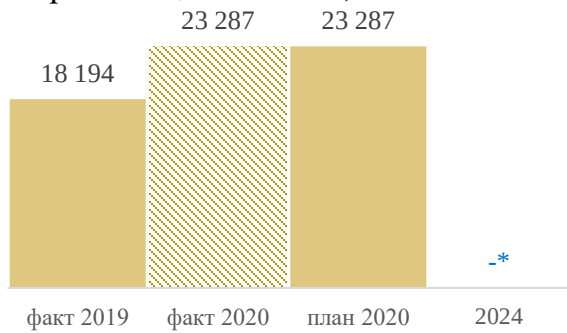


Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях области, ед.*

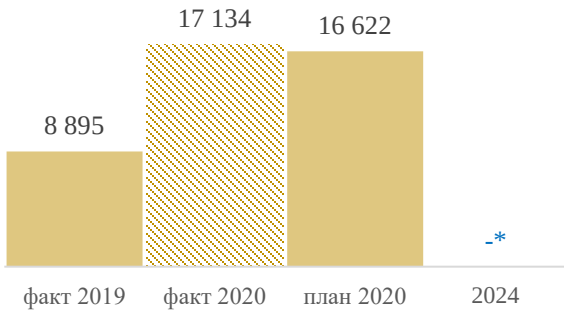

Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций области, подключенных к защищенной сети передачи данных области, %



Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)


Доля государственных медицинских организаций области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, %*




Доля государственных медицинских организаций области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, %

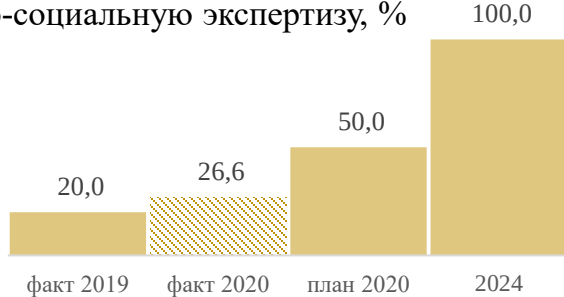


Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медпомощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения области, %*

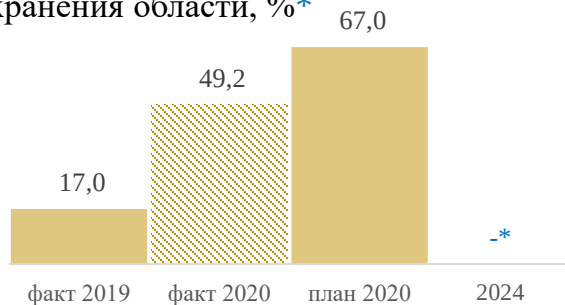


Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)» области, %*

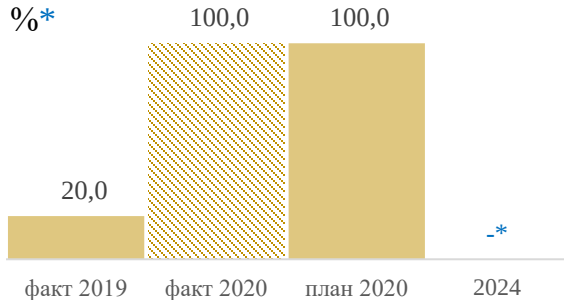

Доля государственных медицинских организаций области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» области, %



Доля аптечных организаций области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» области, %




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)


Доля государственных медицинских организаций области, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую Помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» области, %

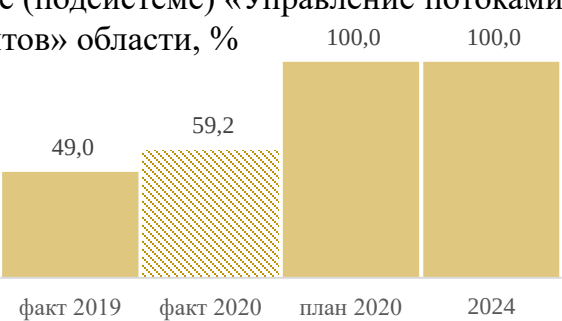


Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Нижегородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» области, %




Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» области, %




Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» области, %



Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» области, %




Доля государственных медицинских организаций области, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» области, %




Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)


Доля государственных медицинских организаций области, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» области, %




Доля государственных медицинских организаций области, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» области, %




Доля государственных медицинских организаций области, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %

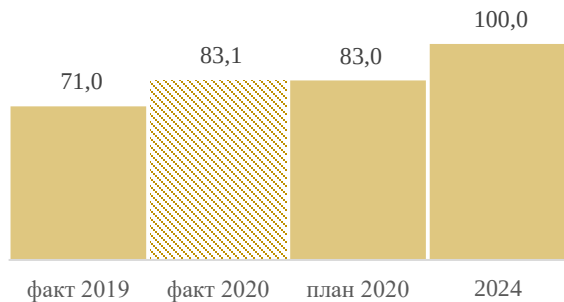


Доля государственных медицинских организаций области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, %

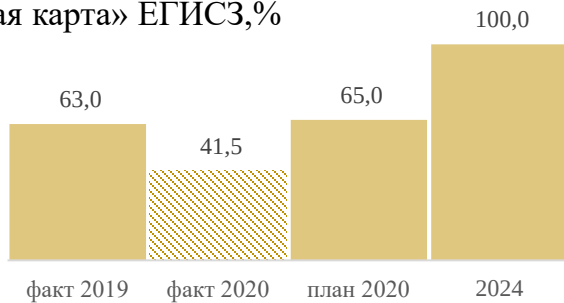

Доля государственных медицинских организаций области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов РФ, соответствующим требованиям Минздрава России, %*

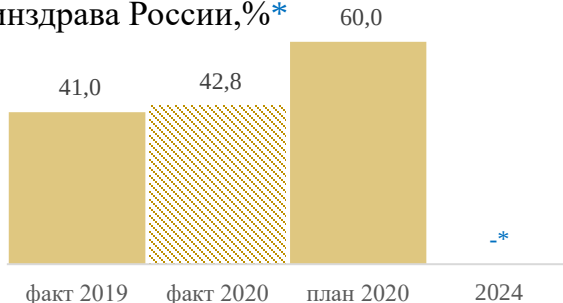

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %*

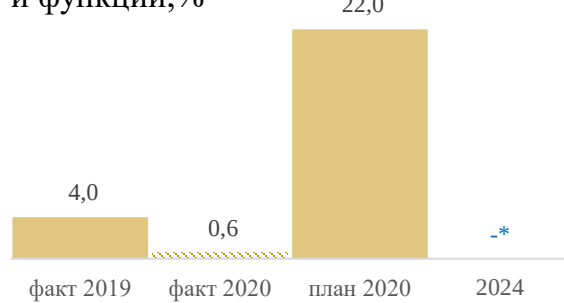


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)


Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %*



Доля отделений государственных медицинских организаций Нижегородской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Нижегородской области, %*

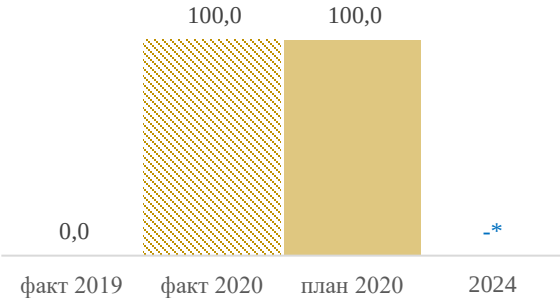


Доля государственных медицинских организаций Нижегородской области, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Нижегородской области, %




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 100,0%

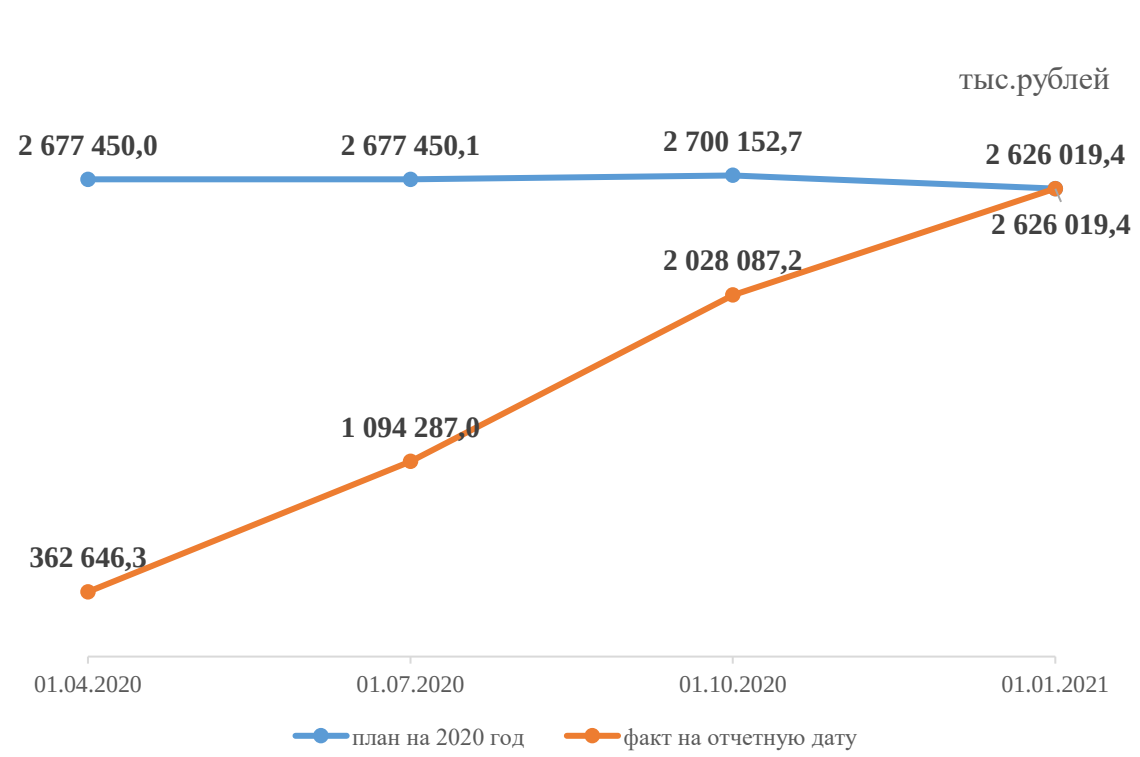

Структура финансирования в разрезе региональных проектов

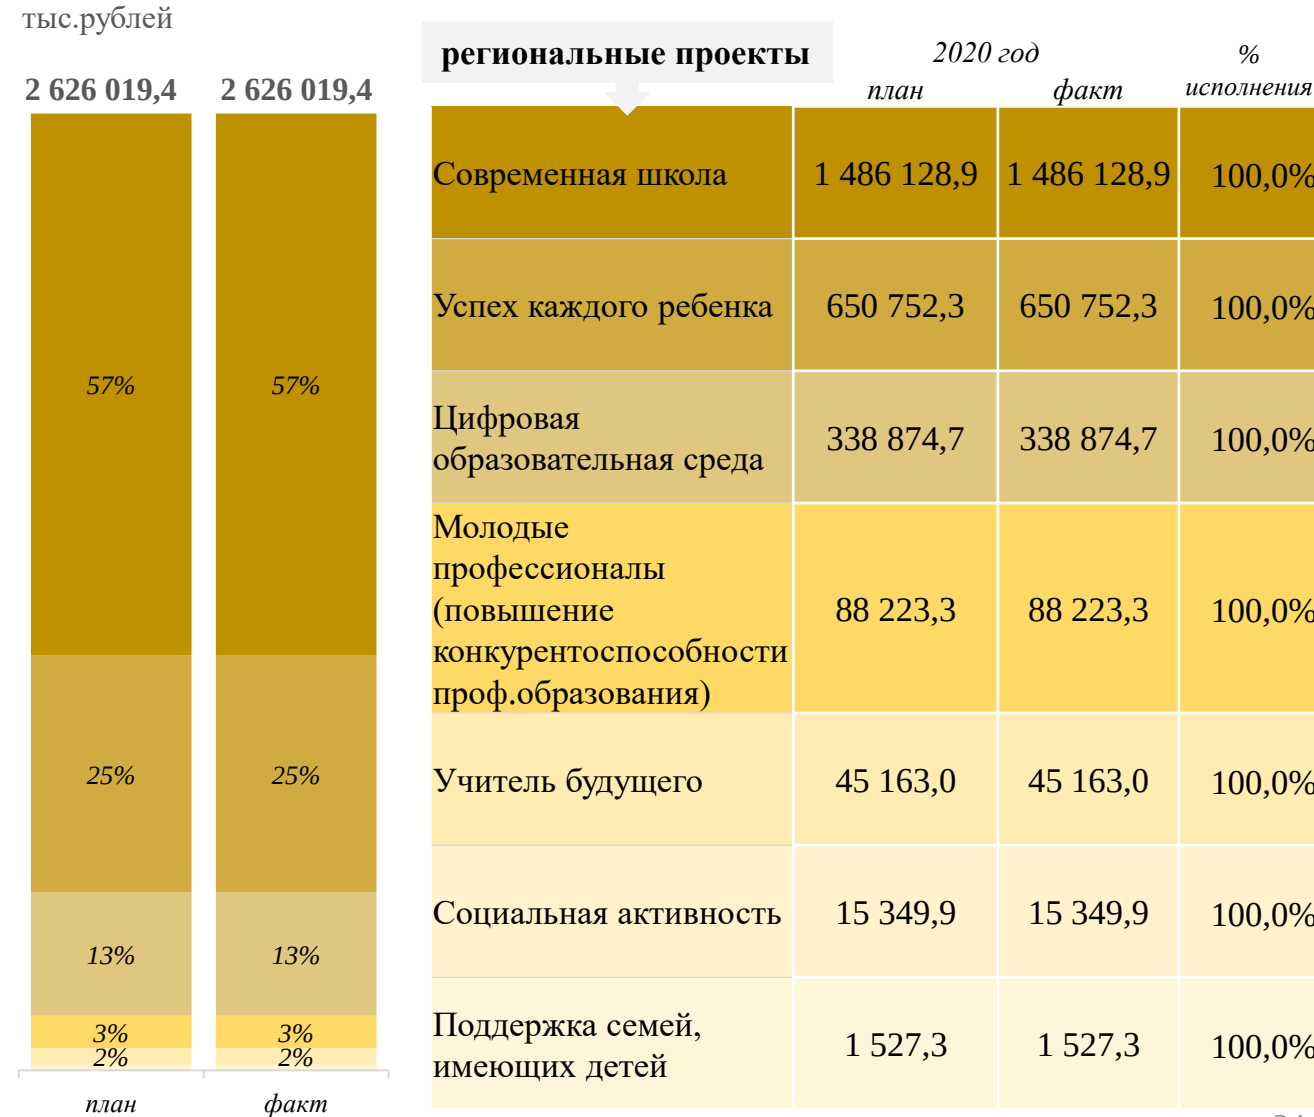


Региональный проект
Современная школа


Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %*

на 2020 год показатель не установлен			
0,000	0,000	0,000	-*
факт 2019	факт 2020	план 2020	2024


Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс.мест*

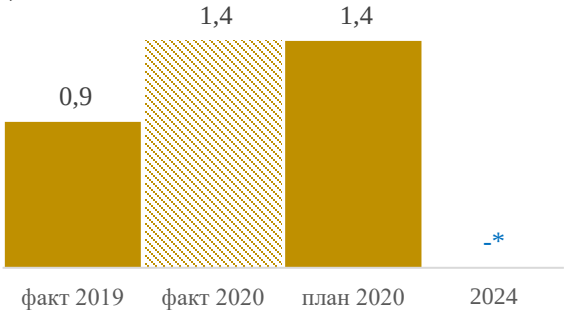


Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.единиц*



Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек*




Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), тыс.мест

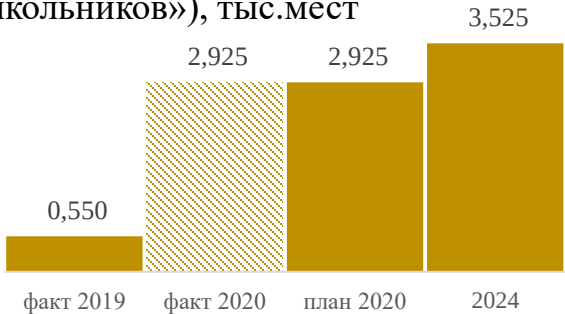


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Региональный проект
Успех каждого ребенка


Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, %




Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн.чел*



Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, тыс.чел.*



Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, ед.*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Цифровая образовательная среда


Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %*




Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %*




Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед.*



Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %*



Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, %*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Поддержка семей, имеющих детей*

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, млн.ед*




Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %*

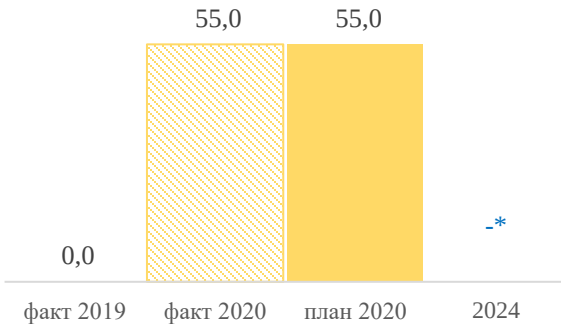


Региональный проект

Учитель будущего*


Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %*



Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, %*

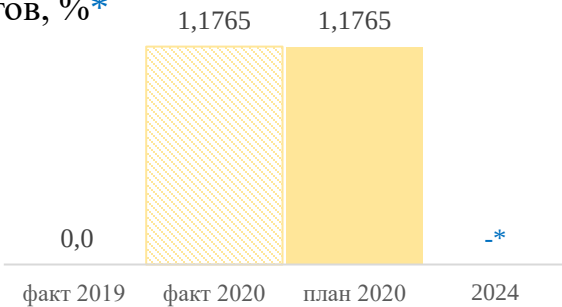

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %*




* - региональный проект по итогам 2020 года досрочно завершен




Региональный проект
Молодые профессионалы


Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %*




Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %*



Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, ед.*

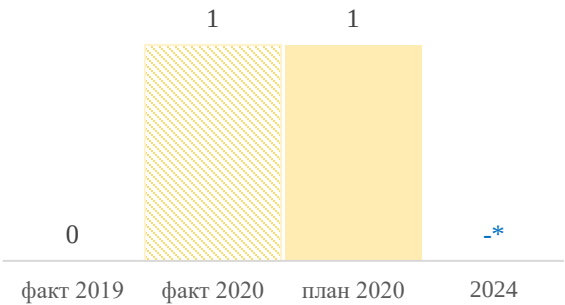


Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, ед.*

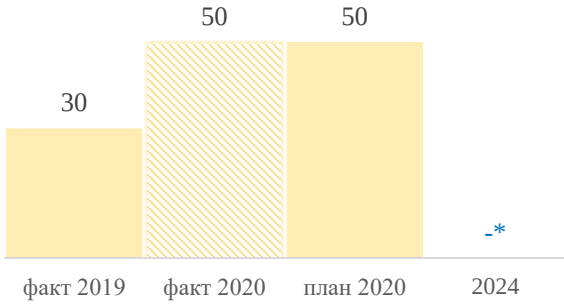


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Региональный проект
Социальная активность


Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, %*




Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек





Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. нарастающим итогом*



Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов, %*

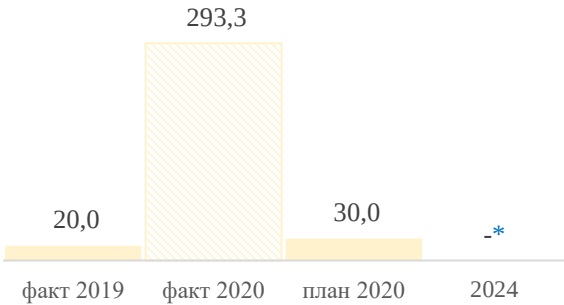


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортom регионального проекта не предусмотрен

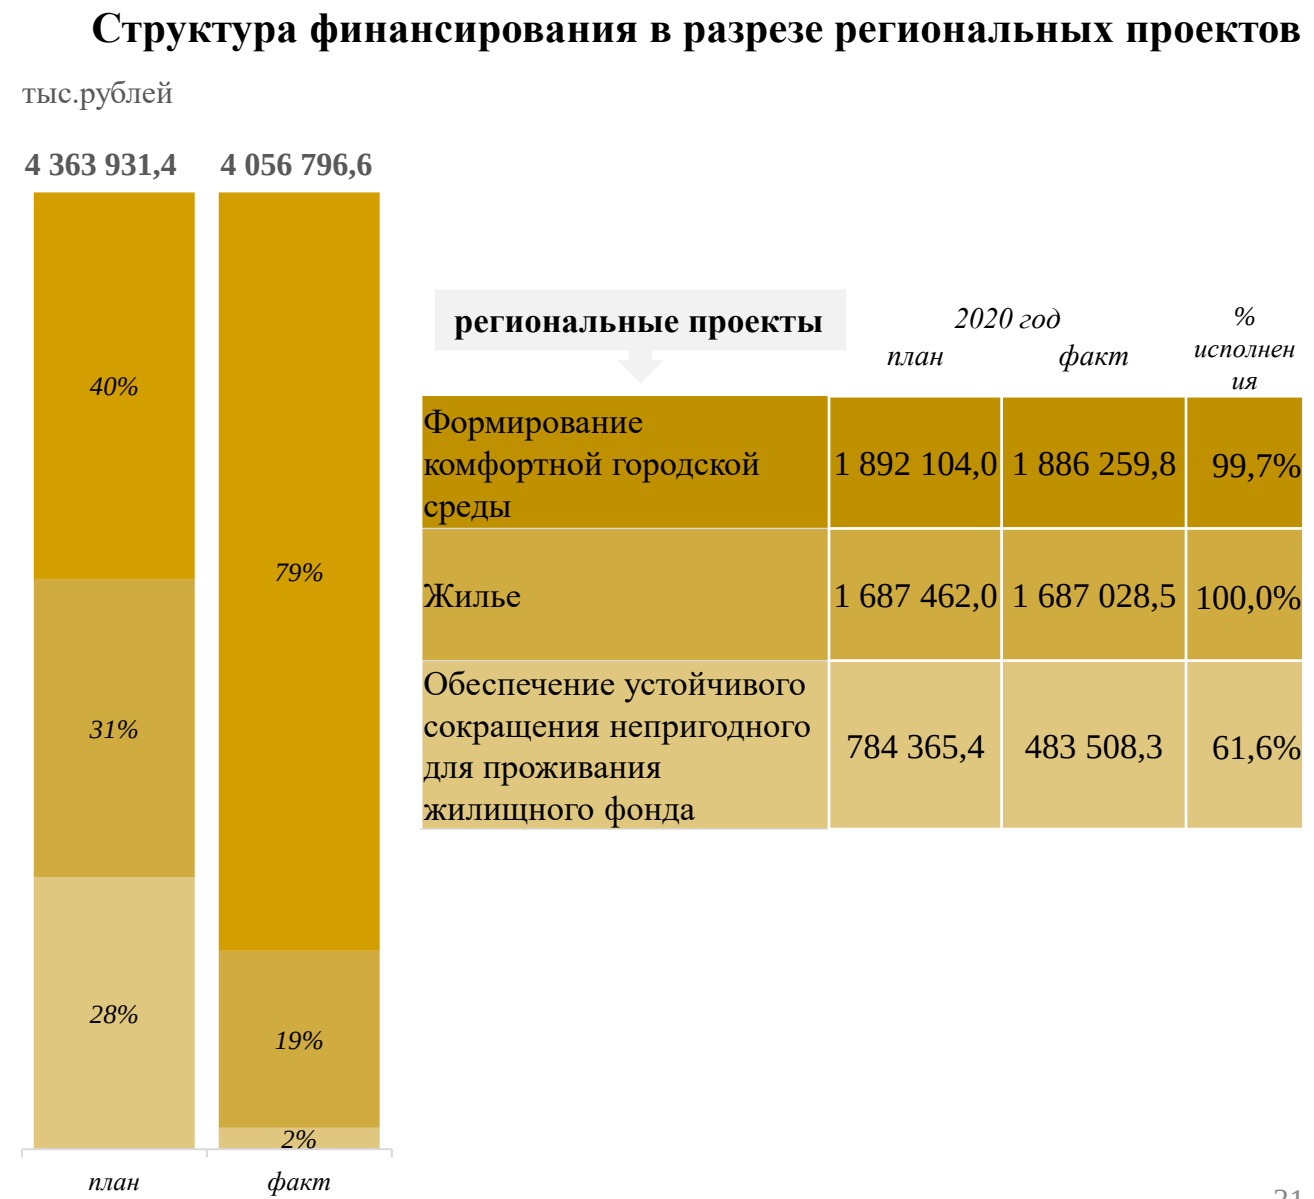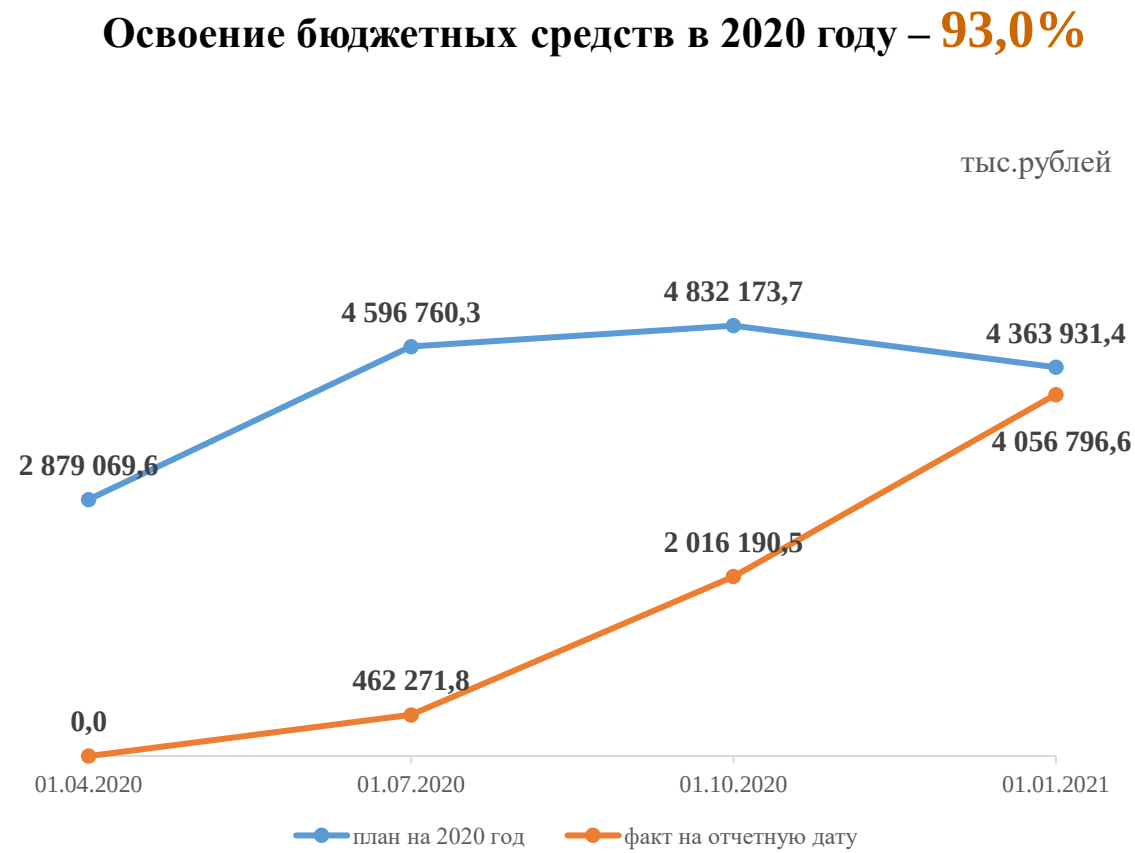


Региональный проект
Жилье


Объем ввода в многоквартирных домах в год, млн.кв.м*

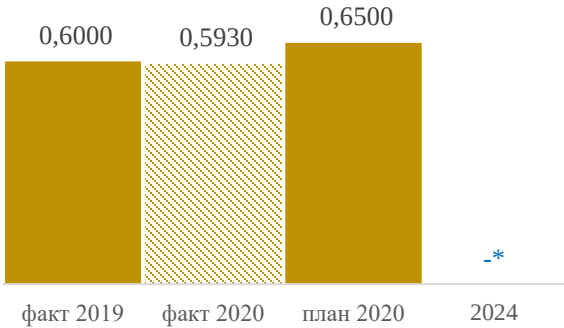


Объем ввода жилья, построенного населением, млн.кв.м*

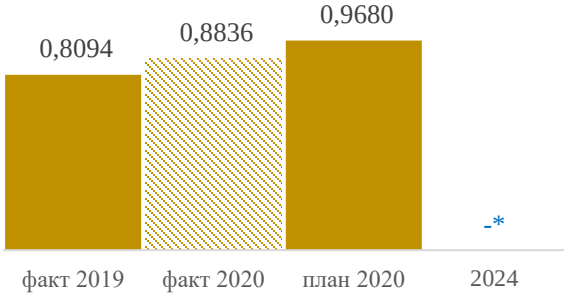


Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, ед. *

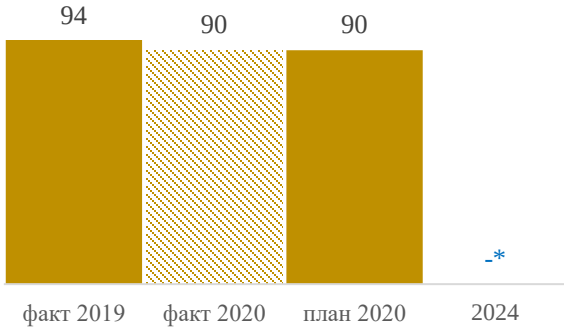

Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, усл.ед.*

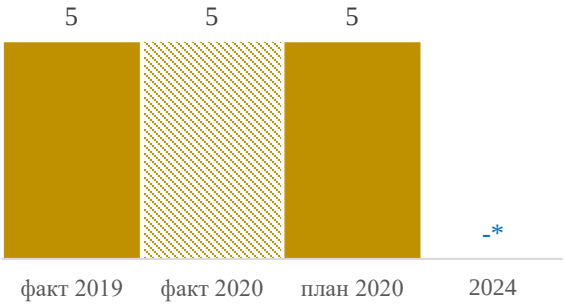


Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства нарастающим итогом, гектар*

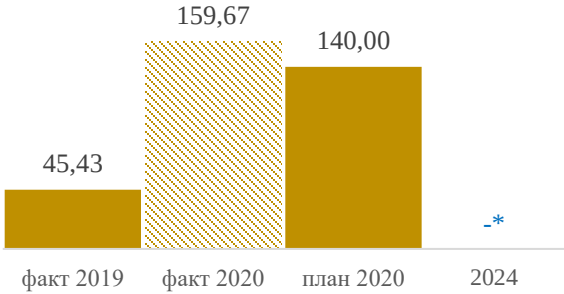


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Региональный проект
Жилье


Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (нарастающим итогом), шт*

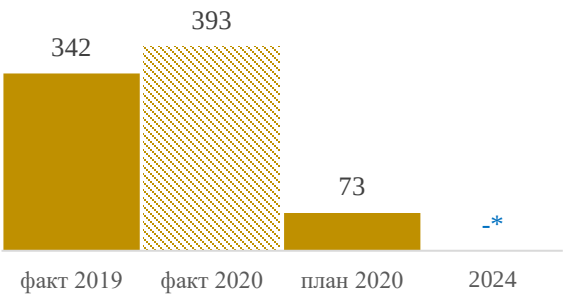


Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн.квадратных метров в год, млн.кв.м

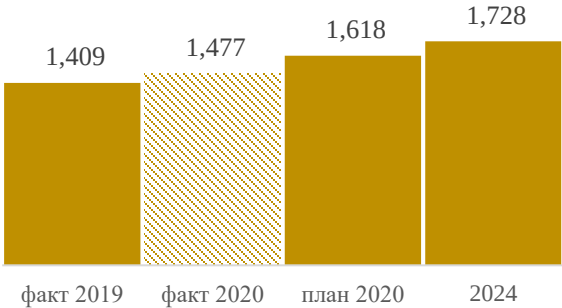


Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн.кв.м*

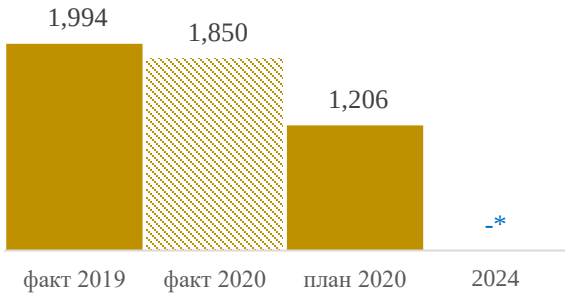

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ, млн.кв.м

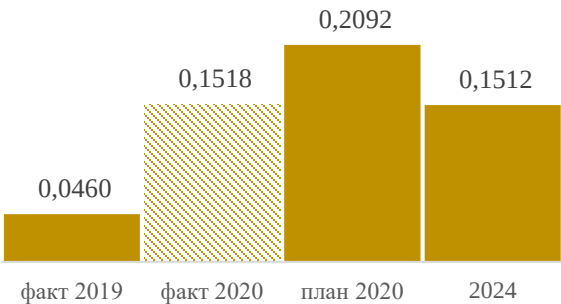

Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, усл.ед.*

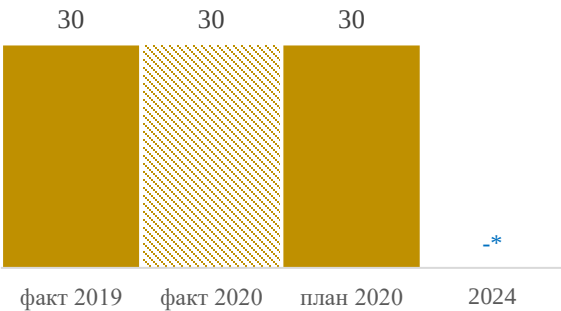


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Формирование комфортной городской среды


Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее 4, нарастающим итогом, ед

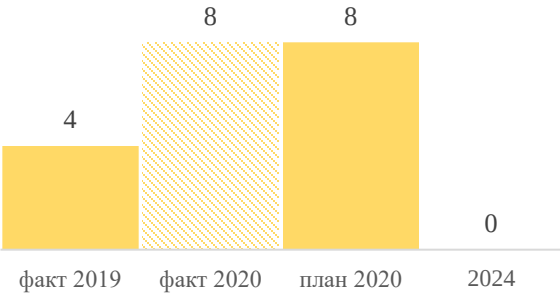


Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %




Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %

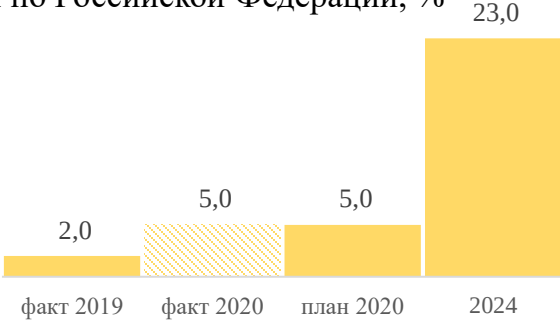


Количество городов с благоприятной городской средой, ед.

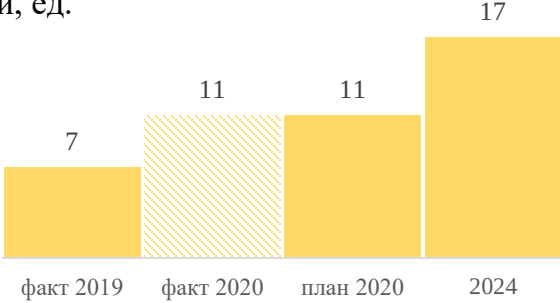


Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, усл.ед.

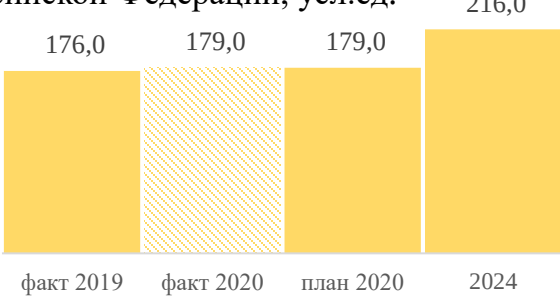

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс.ед. накопительным итогом начиная с 2019 года, ед.

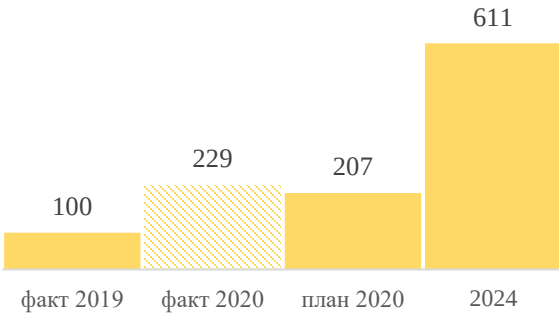


Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды),%

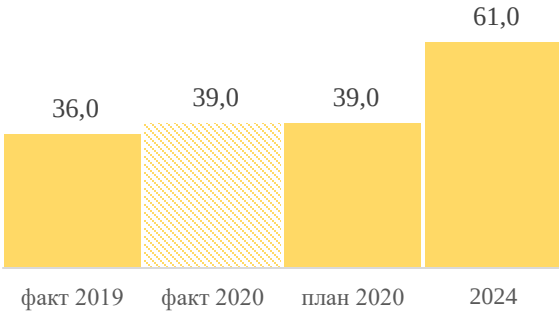


Региональный проект
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда


Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м

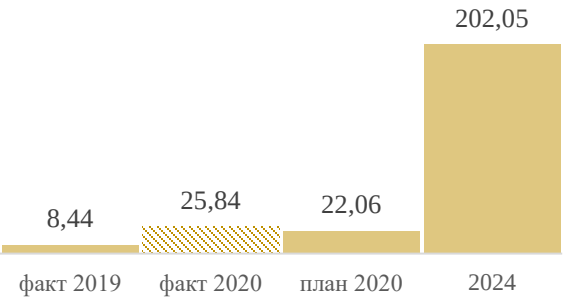


Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.человек

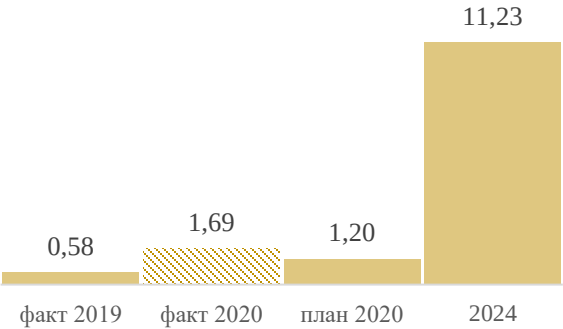

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 97,0%

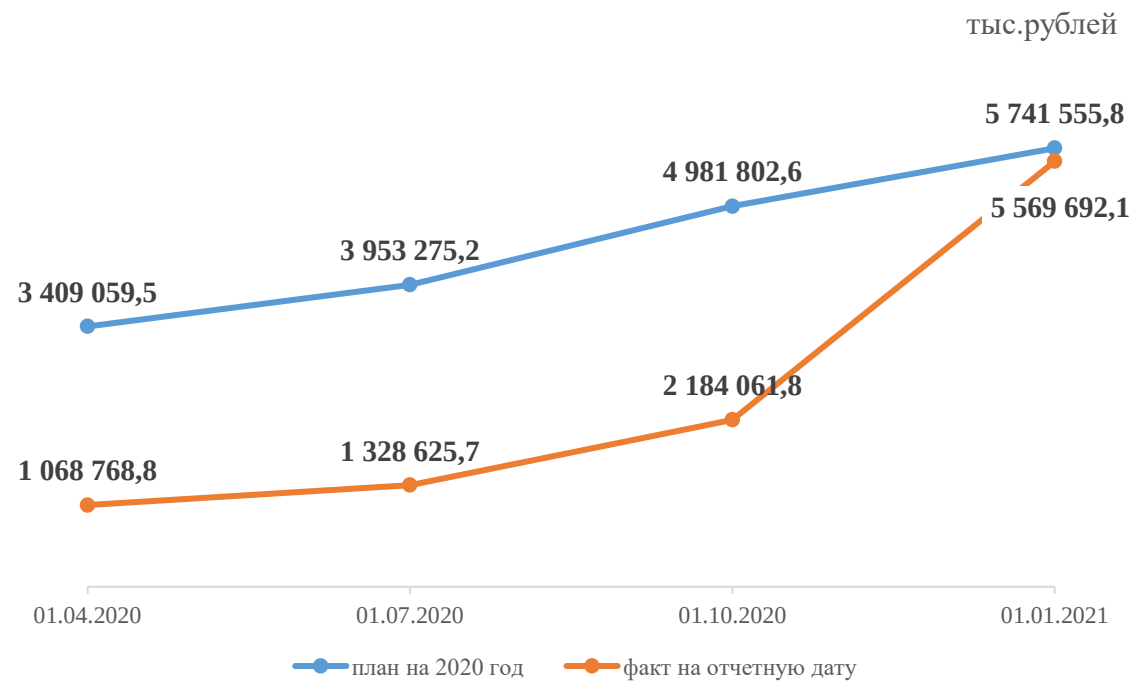

Структура финансирования в разрезе региональных проектов

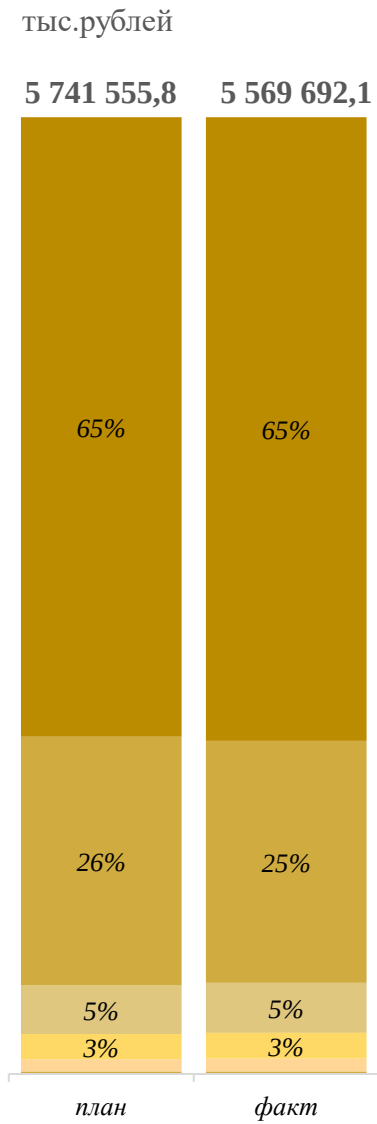


региональные проекты	2020 год		% исполнения
	план	факт	
Оздоровление Волги	3 717 655,9	3 630 667,3	97,7%
Чистая страна	1 492 148,1	1 407 276,5	94,3%
Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	291 825,5	291 825,5	100,0%
Чистая вода	151 045,5	151 042,1	100,0%
Сохранение лесов	73 880,8	73 880,7	100,0%
Сохранение уникальных водных объектов	15 000,0	15 000,0	100,0%

Региональный проект
Чистая страна


Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.




Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

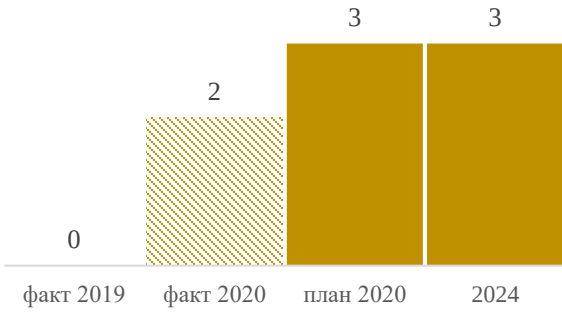

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га*

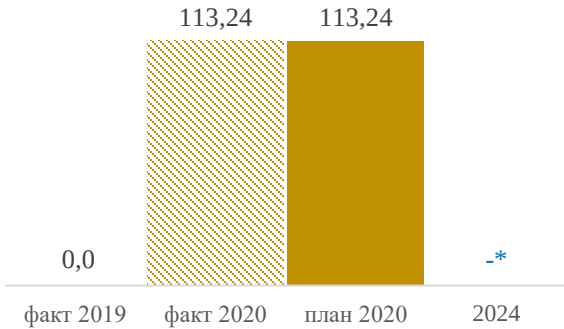

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс.чел.

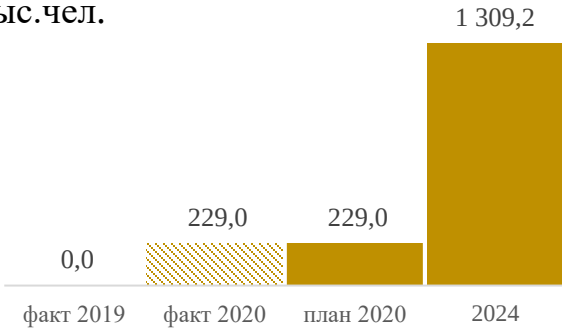


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %

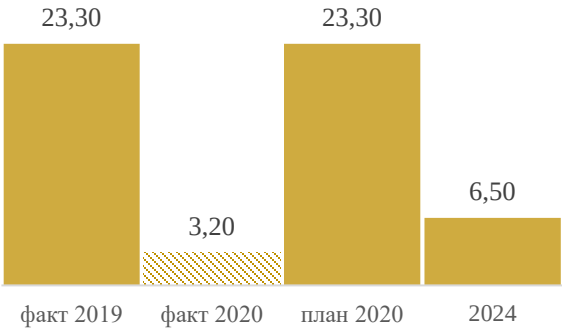


Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %

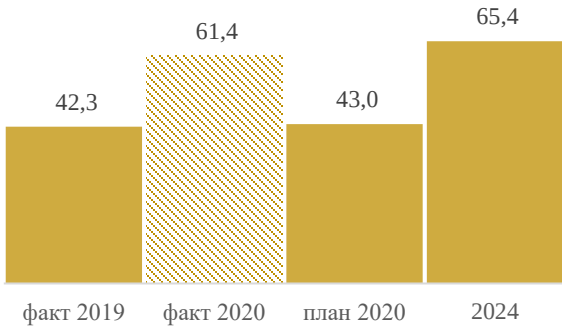


Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %




Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО, шт.*

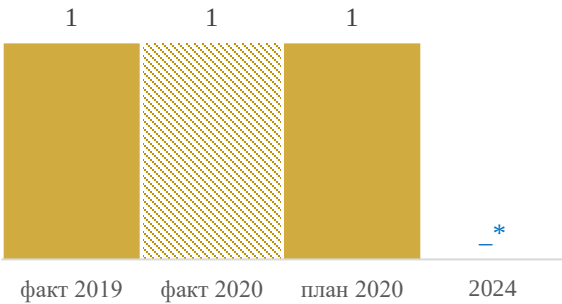

Доля разработанных электронных моделей, %

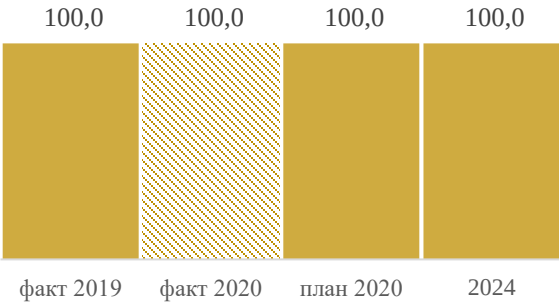

Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО, %




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен




Региональный проект

Чистая вода

Доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

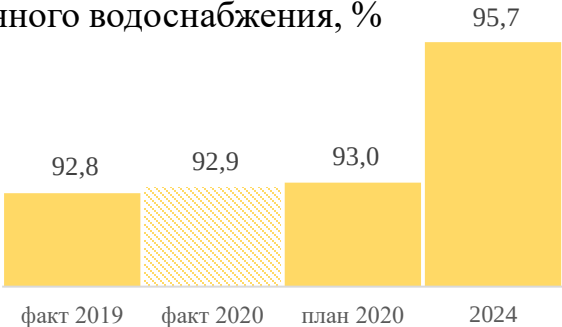

Доля городского населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

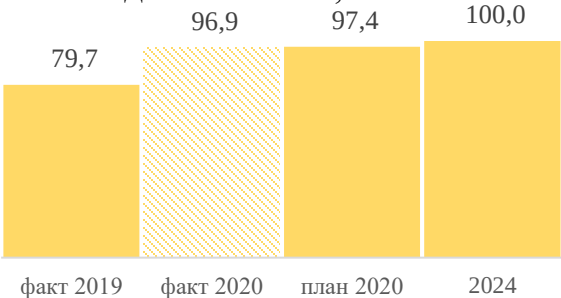

Региональный проект

Сохранение уникальных водных объектов

Протяженность расчищенных участков русел рек, км




Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, млн.чел.




Региональный проект
Оздоровление Волги

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, куб.км

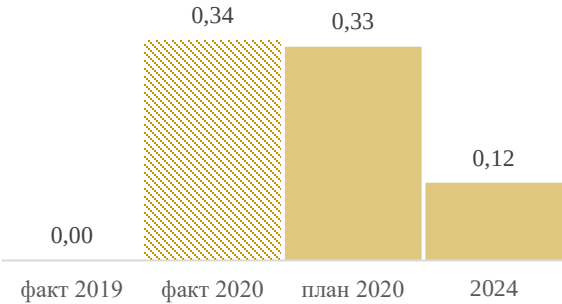

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, куб.км

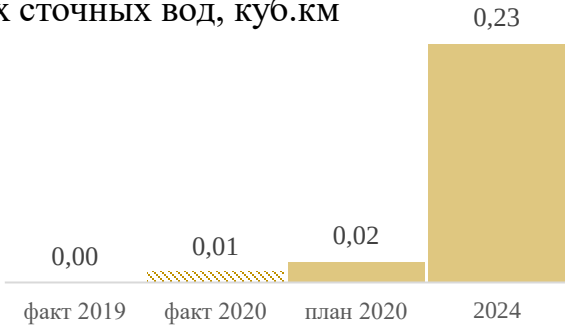


Количество извлеченных из реки Волга и утилизированных судов, ед.*

на 2020 год показатель не установлен			
0	0	0	-*
факт 2019	факт 2020	план 2020	2024


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Региональный проект
Сохранение лесов


Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %

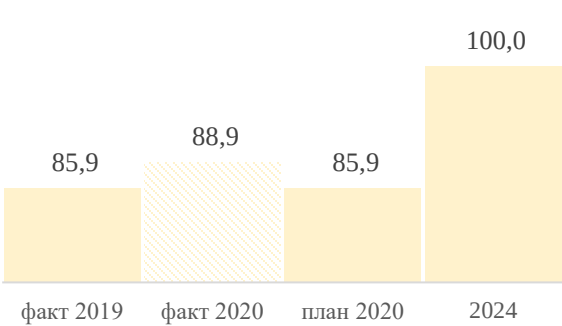


Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс.га

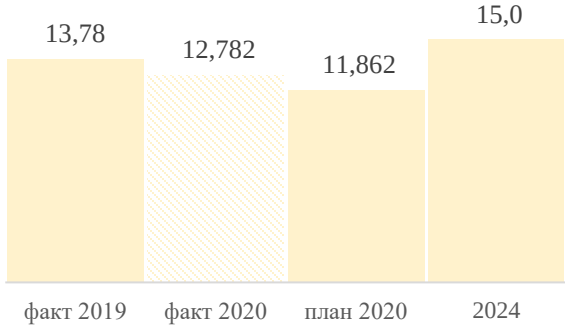


Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.

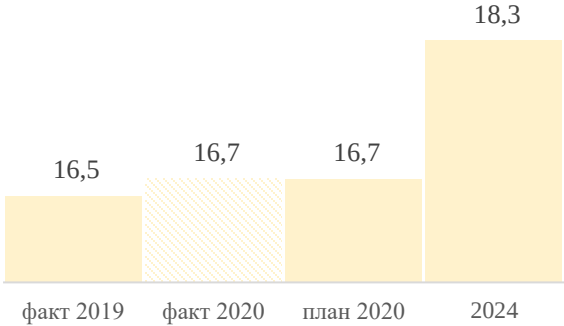


Запас семян лесных растений для лесовосстановления, усл.т

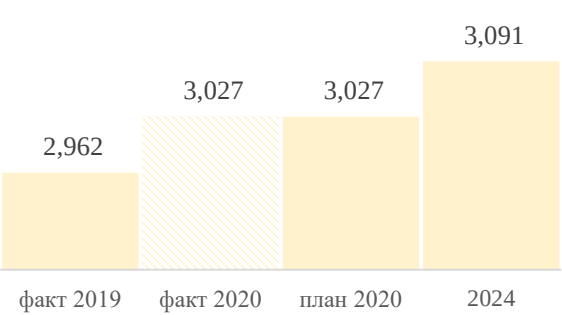

Ущерб от лесных пожаров по годам, млн.руб.

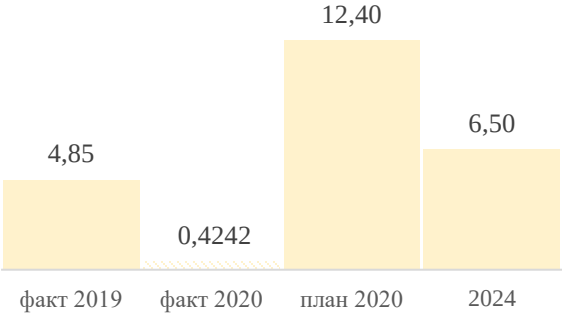


Площадь погибших лесных насаждений, тыс.га

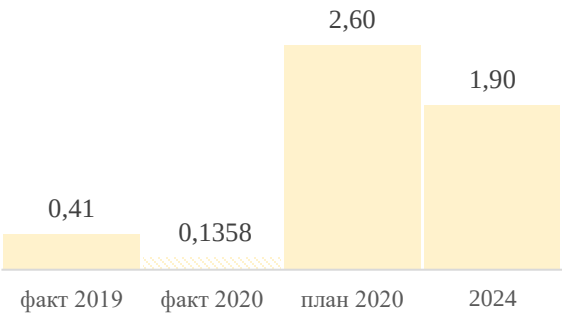


Региональная составляющая национального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги. Финансирование. 2020 год

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 92,5%

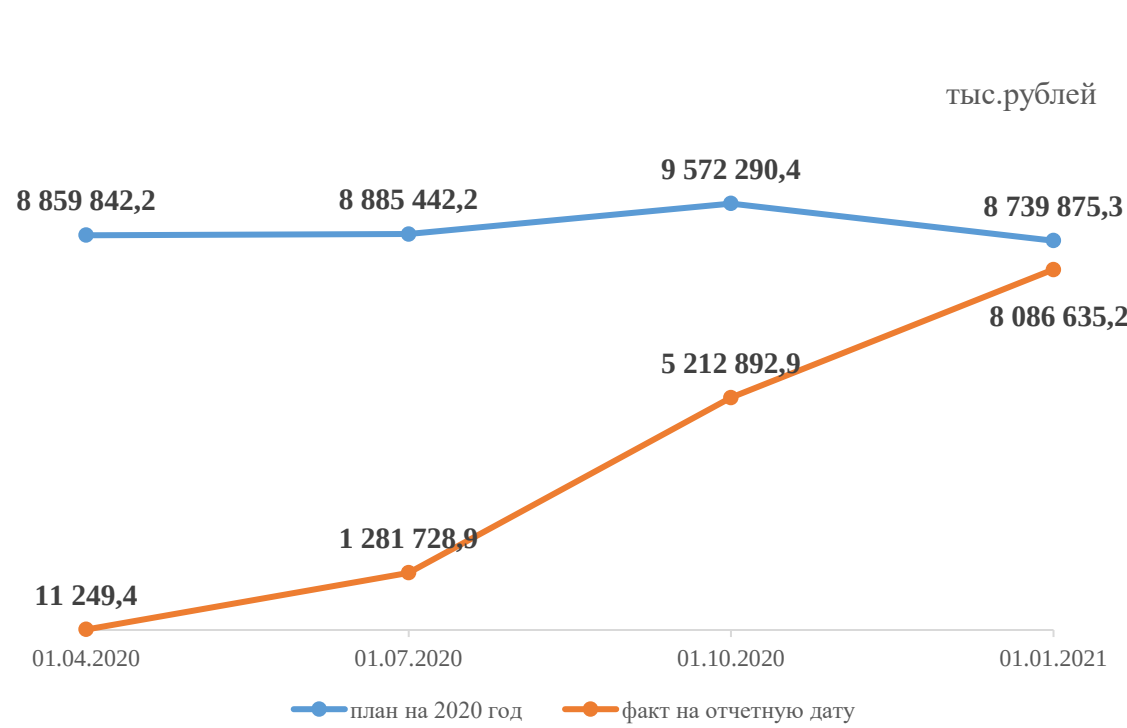

Структура финансирования в разрезе региональных проектов

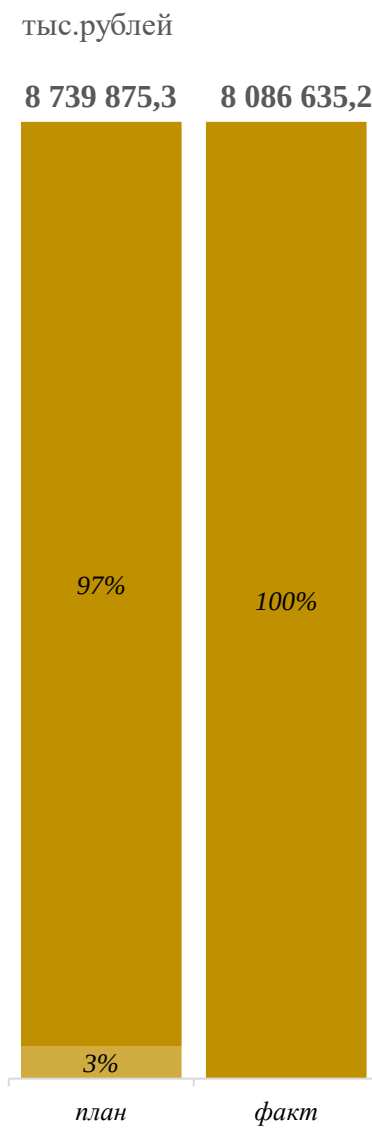

региональные проекты	2020 год		% исполнения
	план	факт	
Дорожная сеть	8 444 321,5	8 084 425,8	95,7%
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	293 910,4	566,0	0,2%
Безопасность дорожного движения	1 643,4	1 643,4	100,0%


Региональная составляющая национального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги. Целевые показатели. 2020 год


Региональный проект

Дорожная сеть


Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

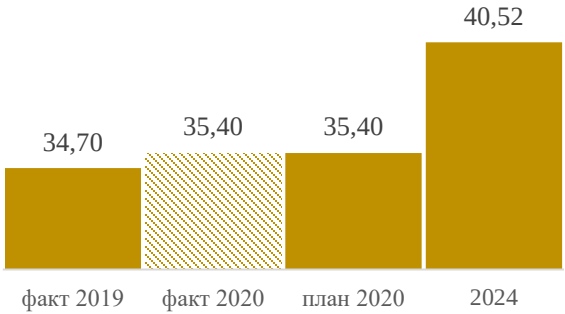


Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

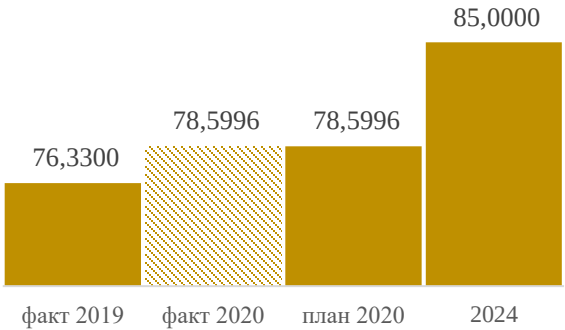

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %*

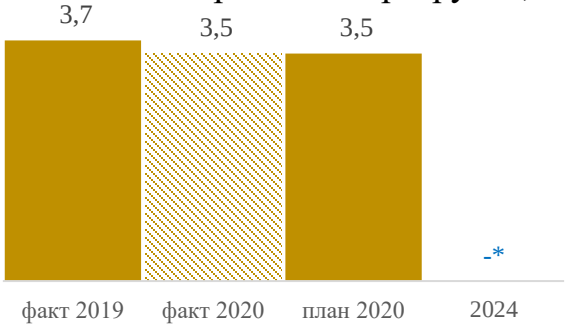

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %*

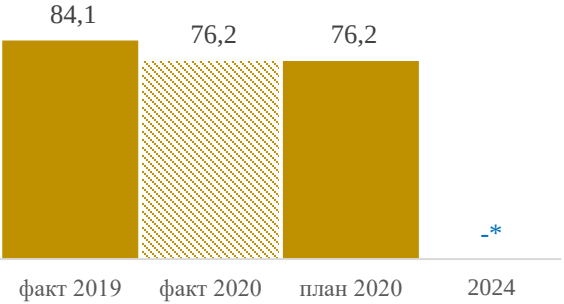

* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональная составляющая национального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги. Целевые показатели. 2020 год


Региональный проект

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %

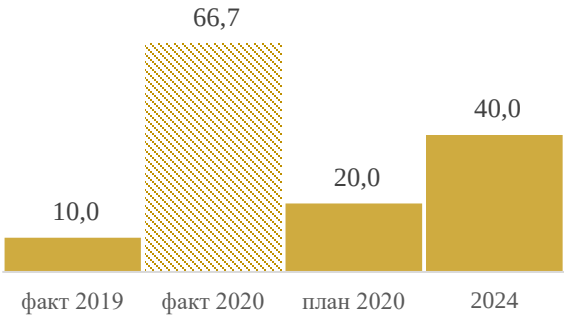


Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %*

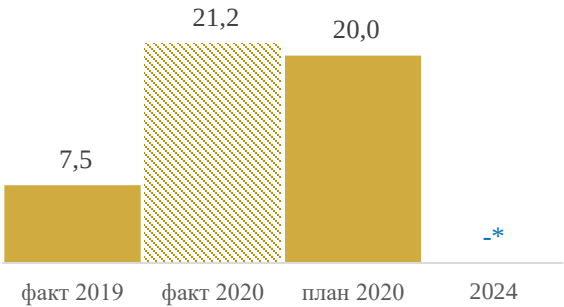

Региональный проект

Безопасность дорожного движения

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел

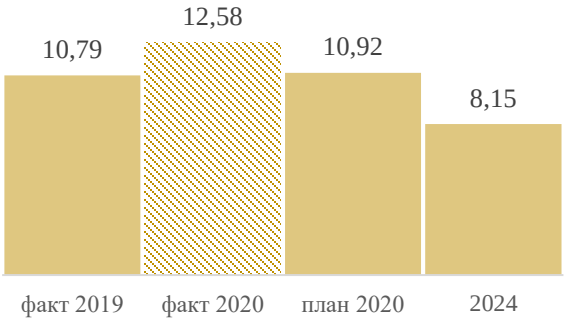


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональная составляющая национального проекта

Производительность труда и поддержка занятости. Финансирование. 2020 год

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 100,0%

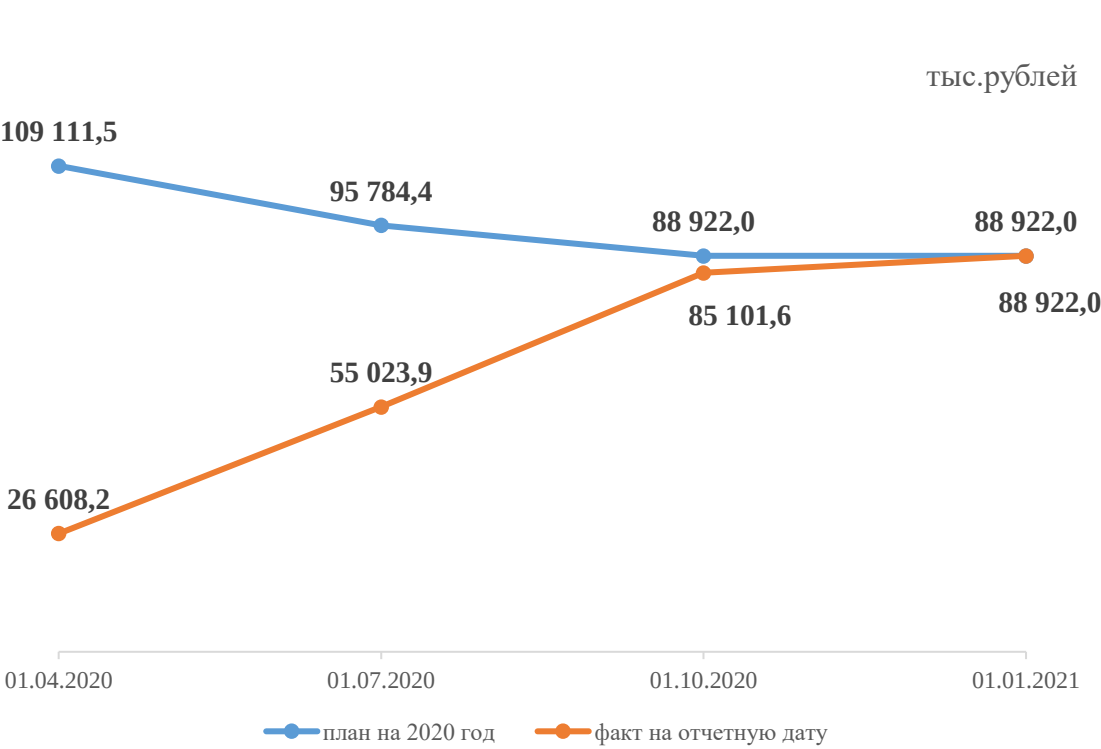


Структура финансирования в разрезе региональных проектов

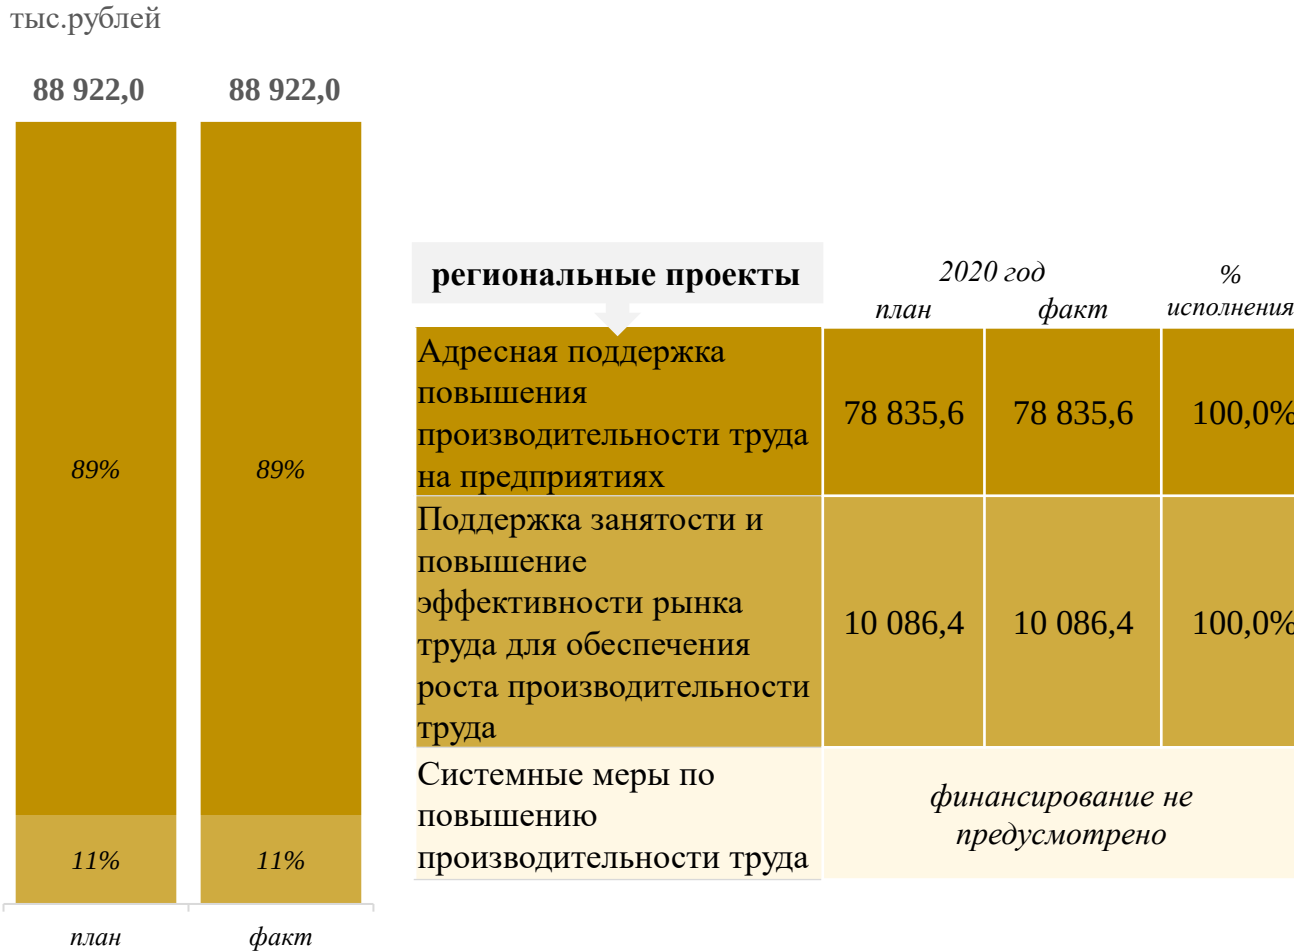




Региональный проект
Системные меры по повышению производительности труда

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, %*

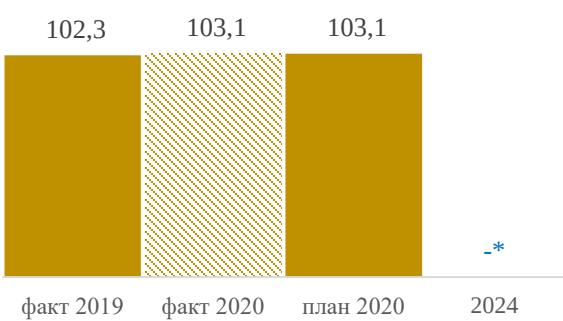

Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), ед.*

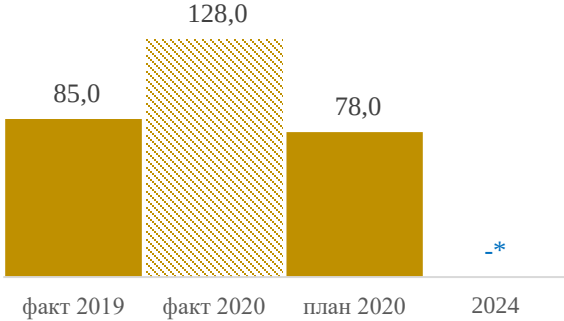

* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Региональная составляющая национального проекта


Производительность труда и поддержка занятости. Целевые показатели. 2020 год




Региональный проект

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях


Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, усл.ед

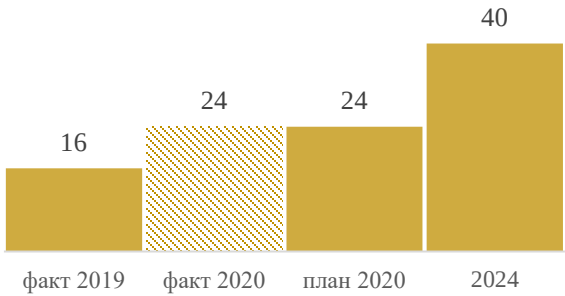


Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

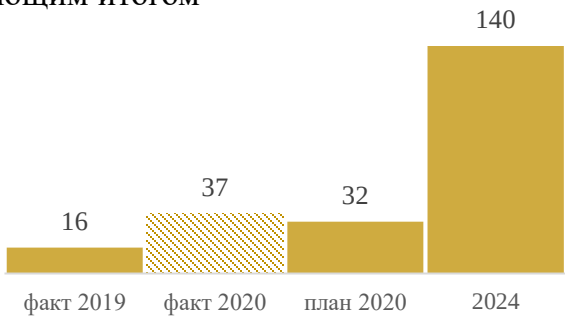

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом, усл.ед.



Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент, %

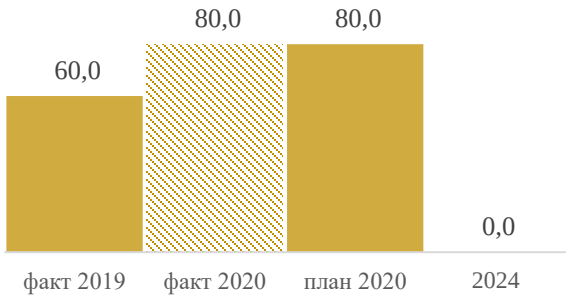

Региональная составляющая национального проекта


Производительность труда и поддержка занятости. Целевые показатели. 2020 год




Региональный проект

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях


Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), тыс. человек нарастающим итогом



Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), тыс. человек нарастающим итогом

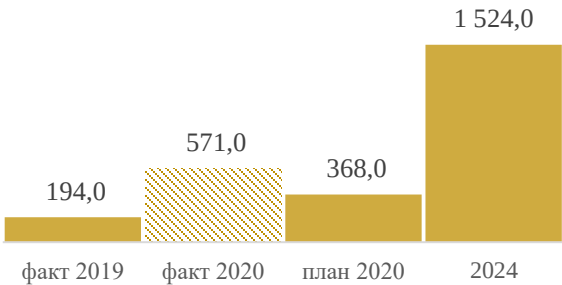

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, тыс. человек нарастающим итогом




Региональная составляющая национального проекта

Производительность труда и поддержка занятости. Целевые показатели. 2020 год


Региональный проект

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда*


Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты - не менее 85 к концу 2024 года, ед.*




Количество государственных учреждений службы занятости, в которых внедрены единые требования, шт.*

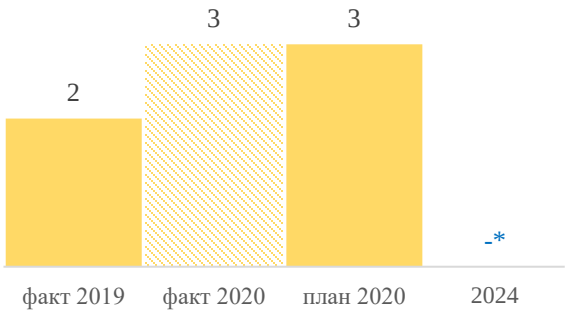


Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года, чел.*




Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года, ед.*



Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году, %*




Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году, %*




* - региональный проект по итогам 2020 года досрочно завершен

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 100,0%

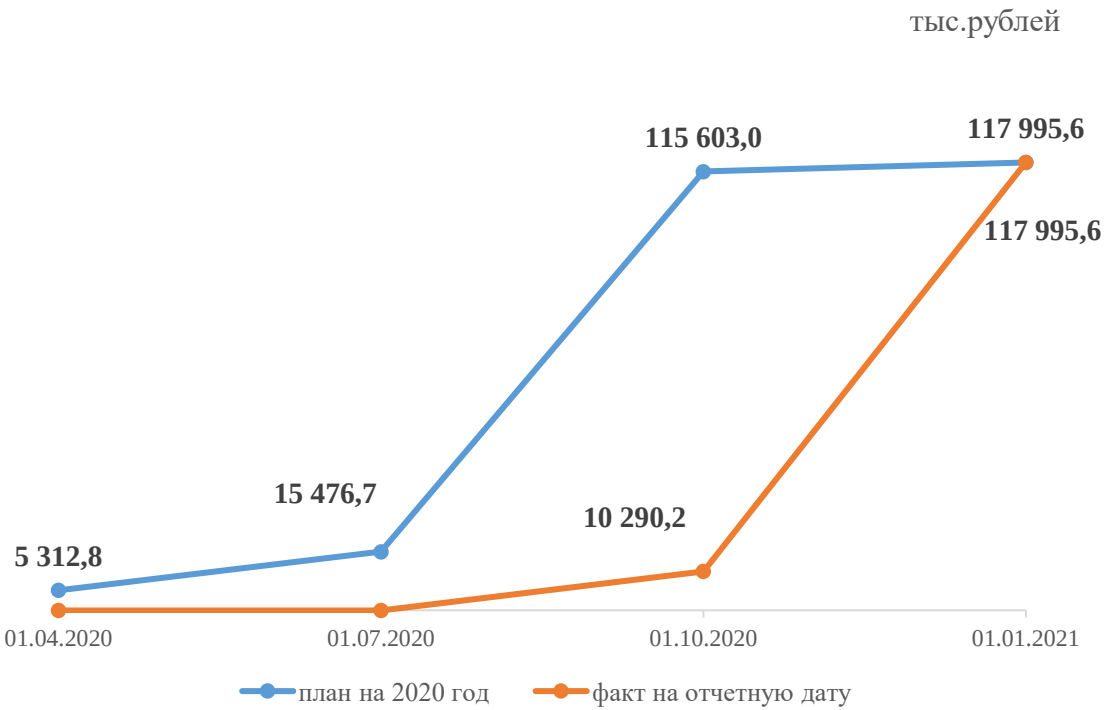


Структура финансирования в разрезе региональных проектов

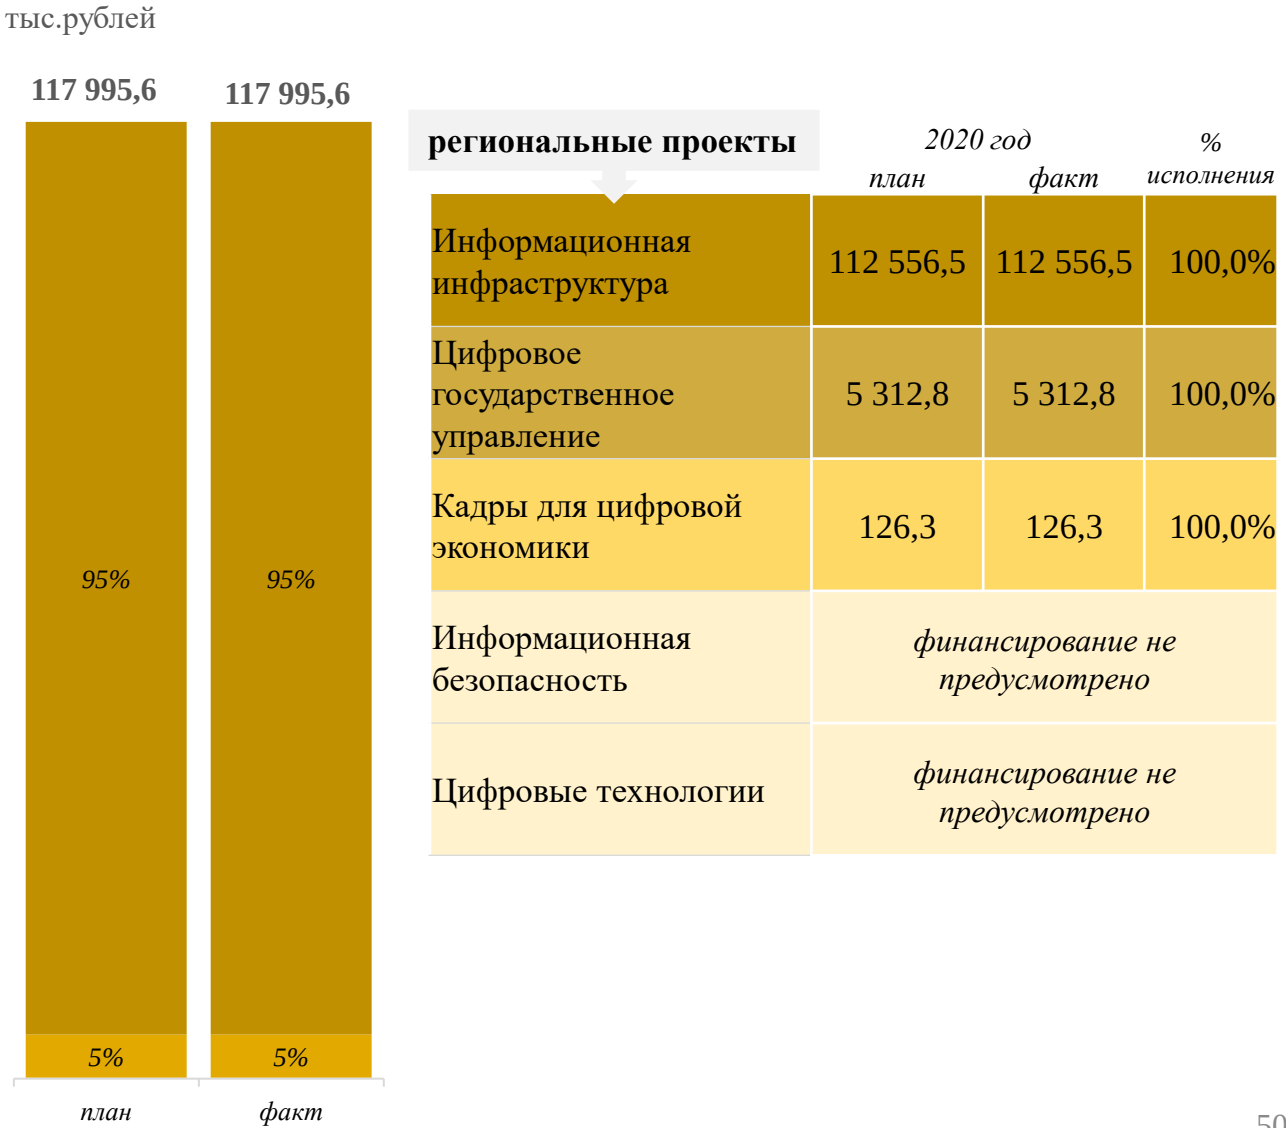


Региональный проект

Информационная инфраструктура


Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %*

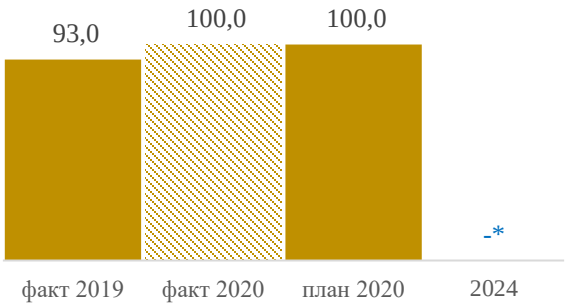


Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», %*



Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %*



Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет», %*

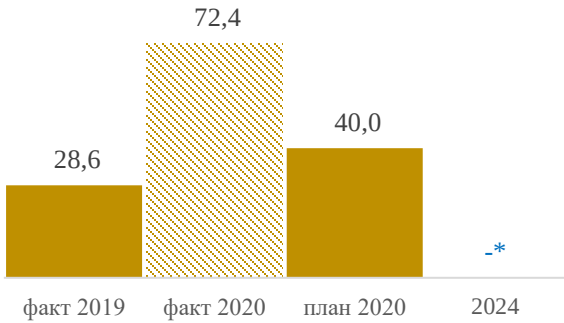


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Кадры для цифровой экономики

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел.*

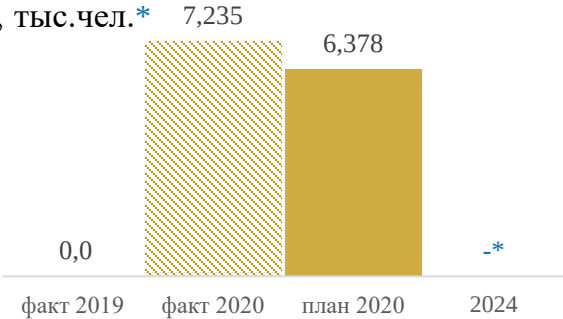


Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.чел.*




Региональный проект

Информационная безопасность

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, ч*




Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс.чел.*

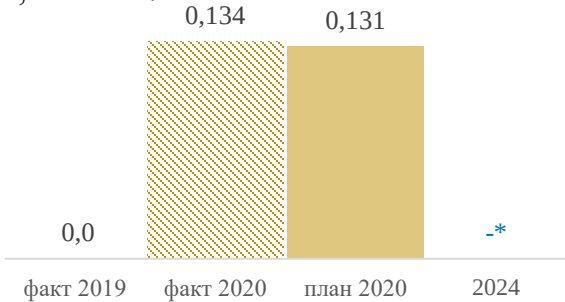


Региональный проект

Цифровые технологии

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаний, зарегистрированных на территории Нижегородской области, %*

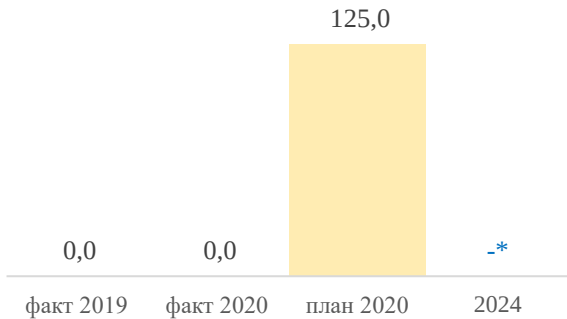

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, %*

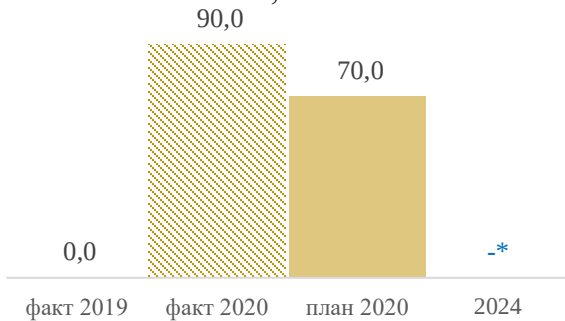


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональные проекты

Цифровое государственное управление


Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %*




Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, %*




Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %*




Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, %*

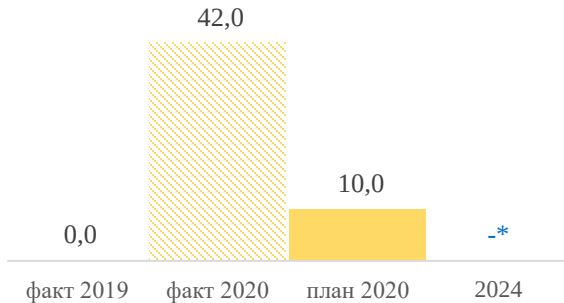

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 100,0%

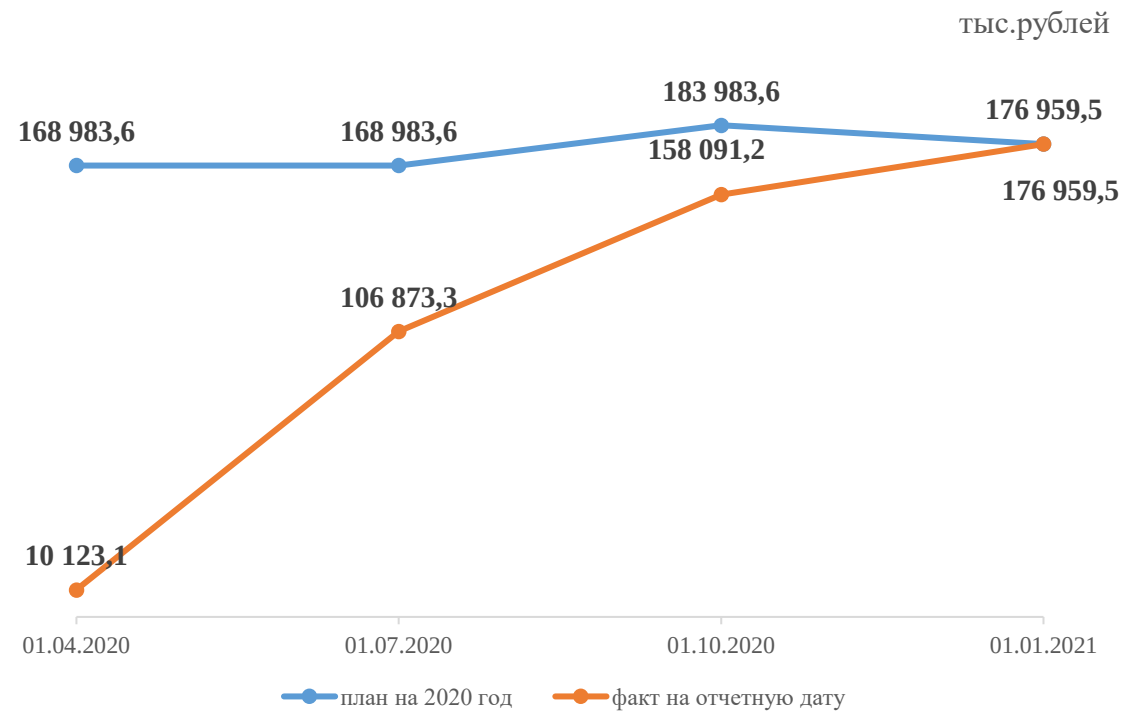

Структура финансирования в разрезе региональных проектов

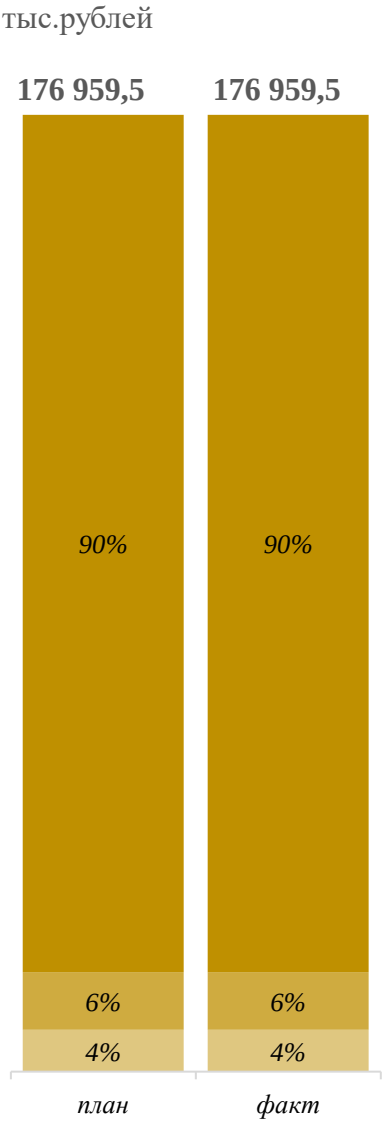


региональные проекты	2020 год		% исполнения
	план	факт	
Культурная среда	158 562,6	158 562,6	100,0%
Творческие люди	10 696,9	10 696,9	100,0%
Цифровая культура	7 700,0	7 700,0	100,0%


Региональный проект

Культурная среда


Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, тыс.чел.*

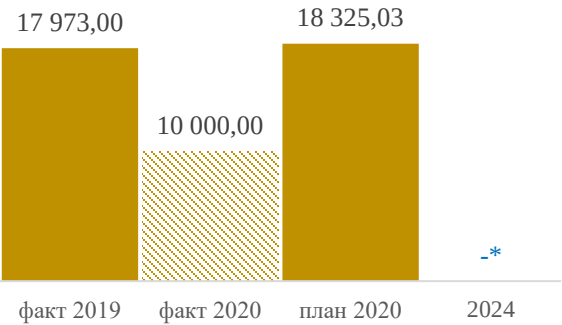

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом), ед.

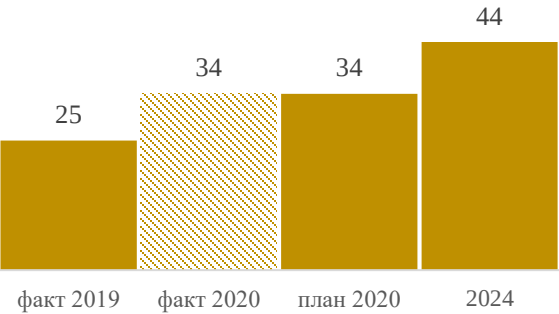

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), ед.

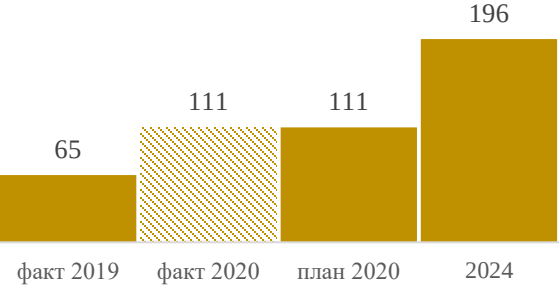


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен




Региональный проект

Творческие люди


Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, чел.



Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом), ед.*




Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом), чел.



Региональный проект


Цифровая культура

Количество созданных виртуальных концертных залов, ед.



* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 100,0%

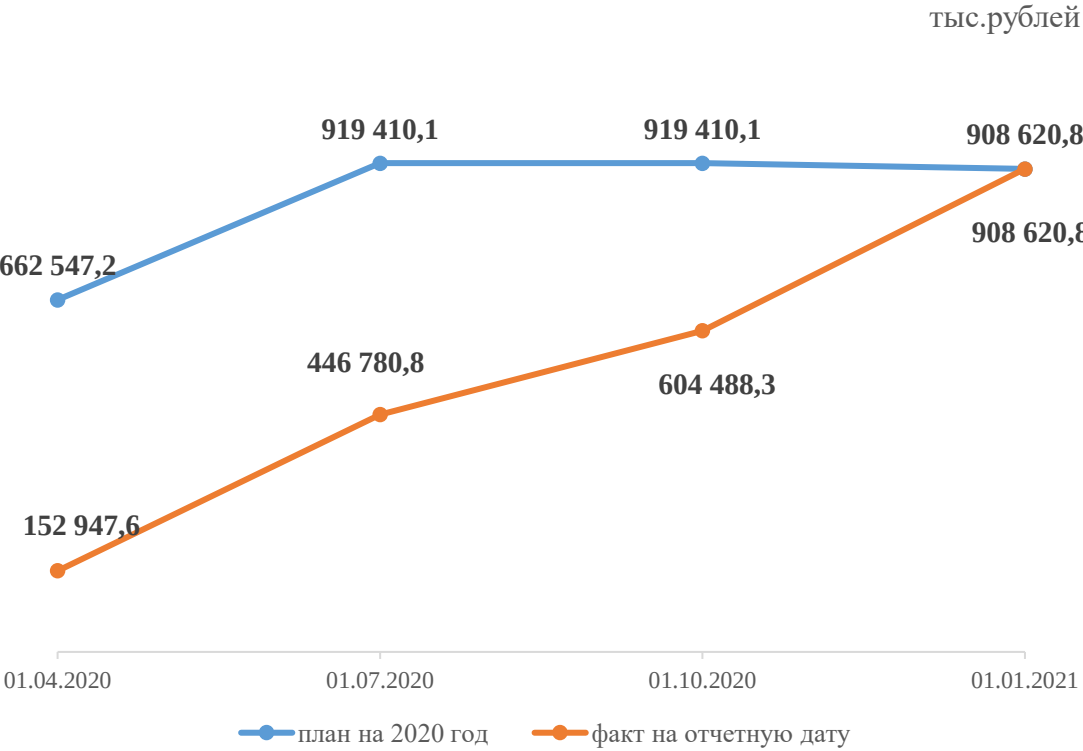

Структура финансирования в разрезе региональных проектов







Региональный проект

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности – «Условия для бизнеса»*

Общее количество объектов государственного и муниципального имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП на льготных условиях, нарастающим итогом, единиц*




Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн.чел.*




* - региональный проект по итогам 2020 года досрочно завершен

Региональный проект
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Количество предоставленных поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом), ед.*

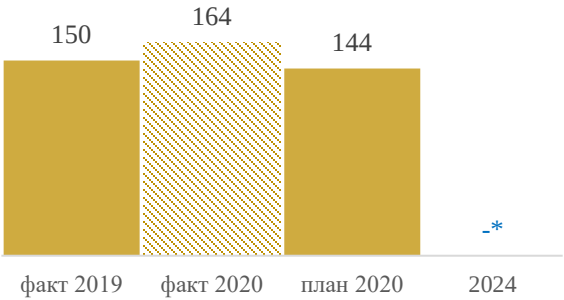


Количество выданных микрозаймов МФО субъектам малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом), ед.*

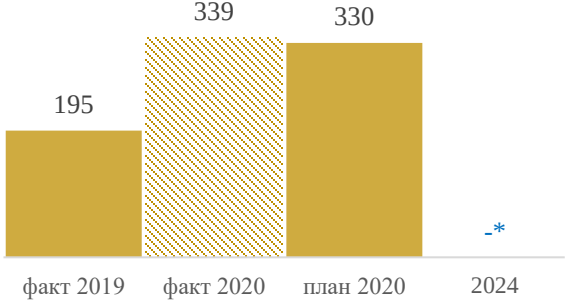


* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Региональный проект
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, тыс.ед.*



Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, ед.*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен


Региональный проект

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации*


Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом), чел.*

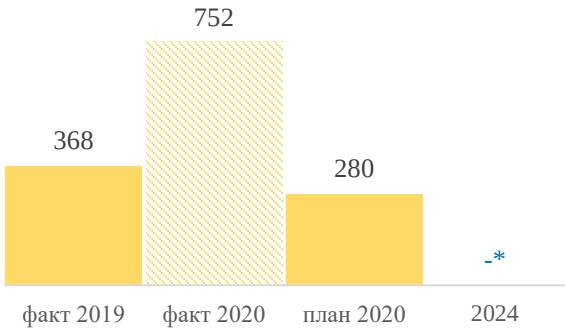


Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом), чел.*



Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), ед.*



Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом), ед.*




* - региональный проект по итогам 2020 года досрочно завершен




Региональный проект

Популяризация предпринимательства*


Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, тыс.чел.*




Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, тыс.ед.*



Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс.чел.*




Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, тыс.чел.*




* - региональный проект по итогам 2020 года досрочно завершен

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 100,0%

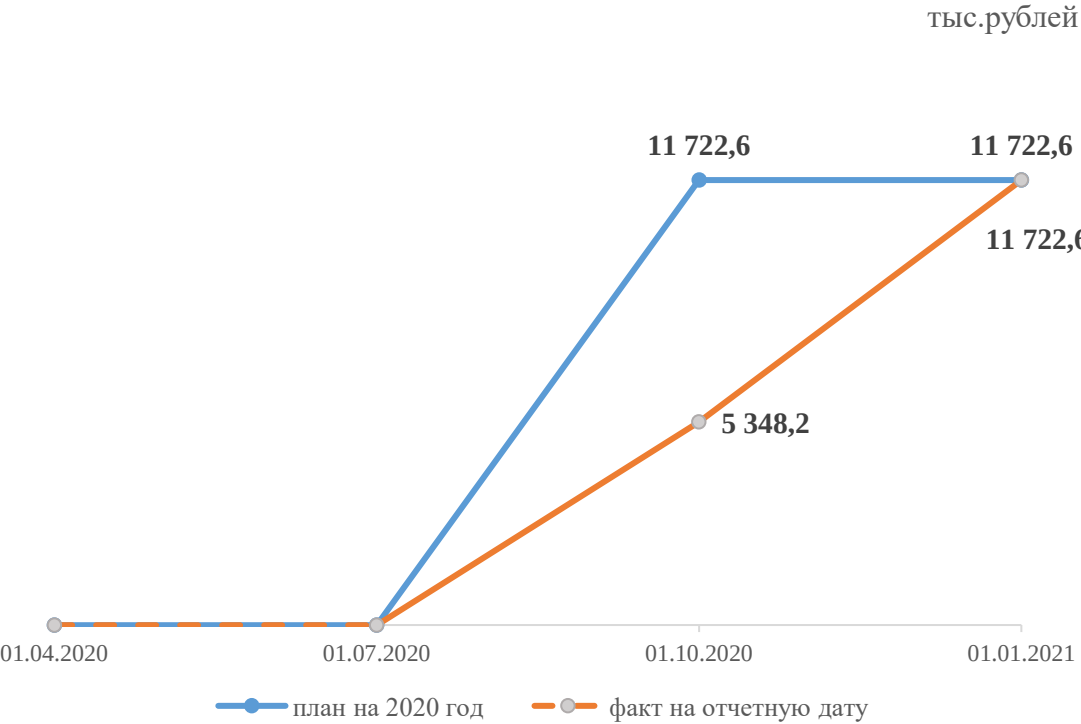

Структура финансирования в разрезе региональных проектов

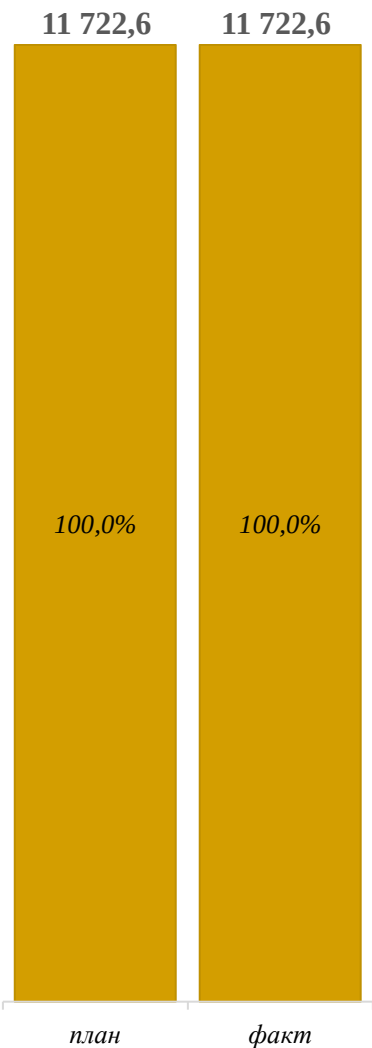

региональные проекты	2020 год		% исполнения
	план	факт	
Экспорт продукции АПК	11 722,6	11 722,6	100%
Экспорт услуг	финансирование не предусмотрено		
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	финансирование не предусмотрено		

Региональная составляющая национального проекта

Международная кооперация и экспорт. Целевые показатели. 2020 год



Региональный проект

Экспорт продукции АПК

Объем экспорта









Региональная составляющая национального проекта

Международная кооперация и экспорт. Целевые показатели. 2020 год

Региональный проект

Экспорт услуг*

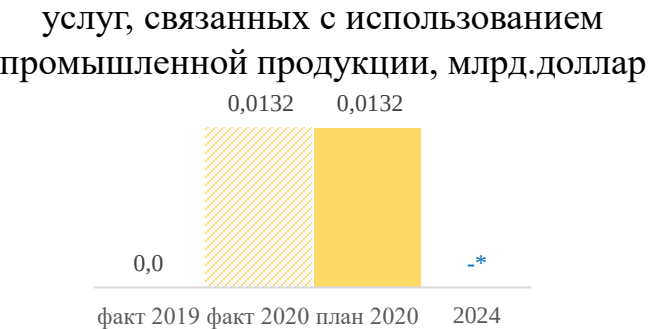


* - региональный проект по итогам 2020 года досрочно завершен




Региональный проект
Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.




Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, к 2018 году, %*




* - на 2021 и последующие годы показатель паспортом регионального проекта не предусмотрен

Освоение бюджетных средств в 2020 году – 81,6%

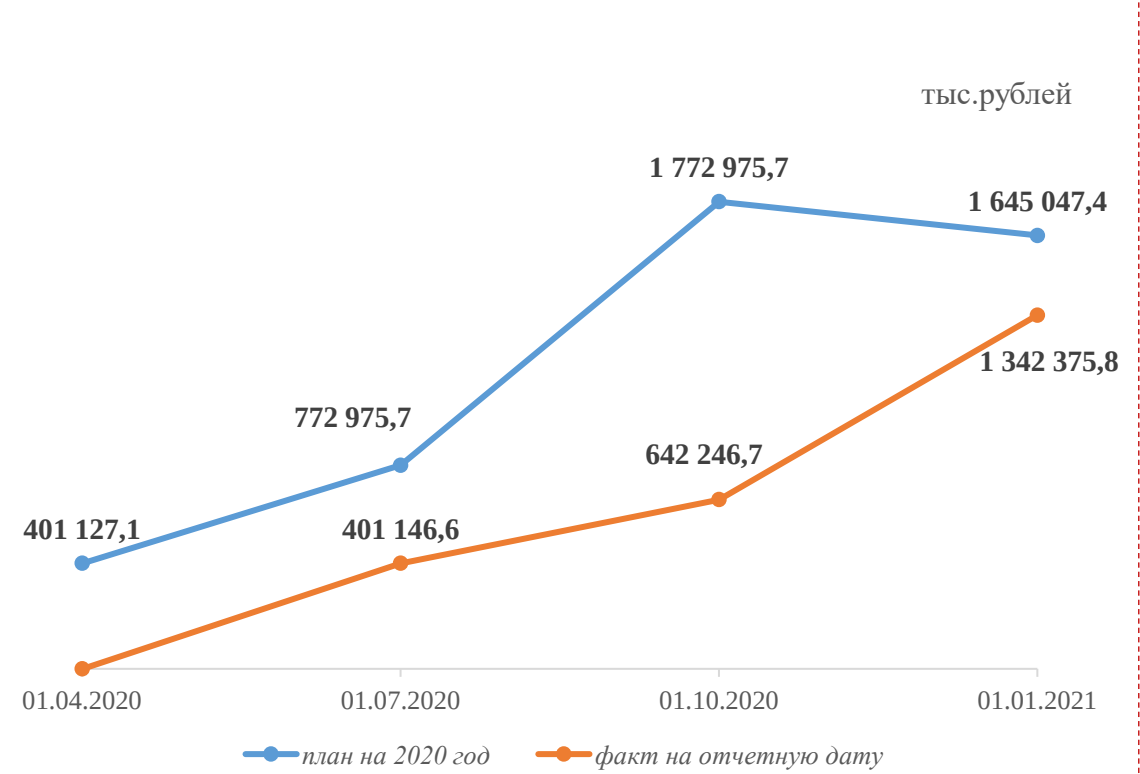


Структура финансирования в разрезе региональных проектов

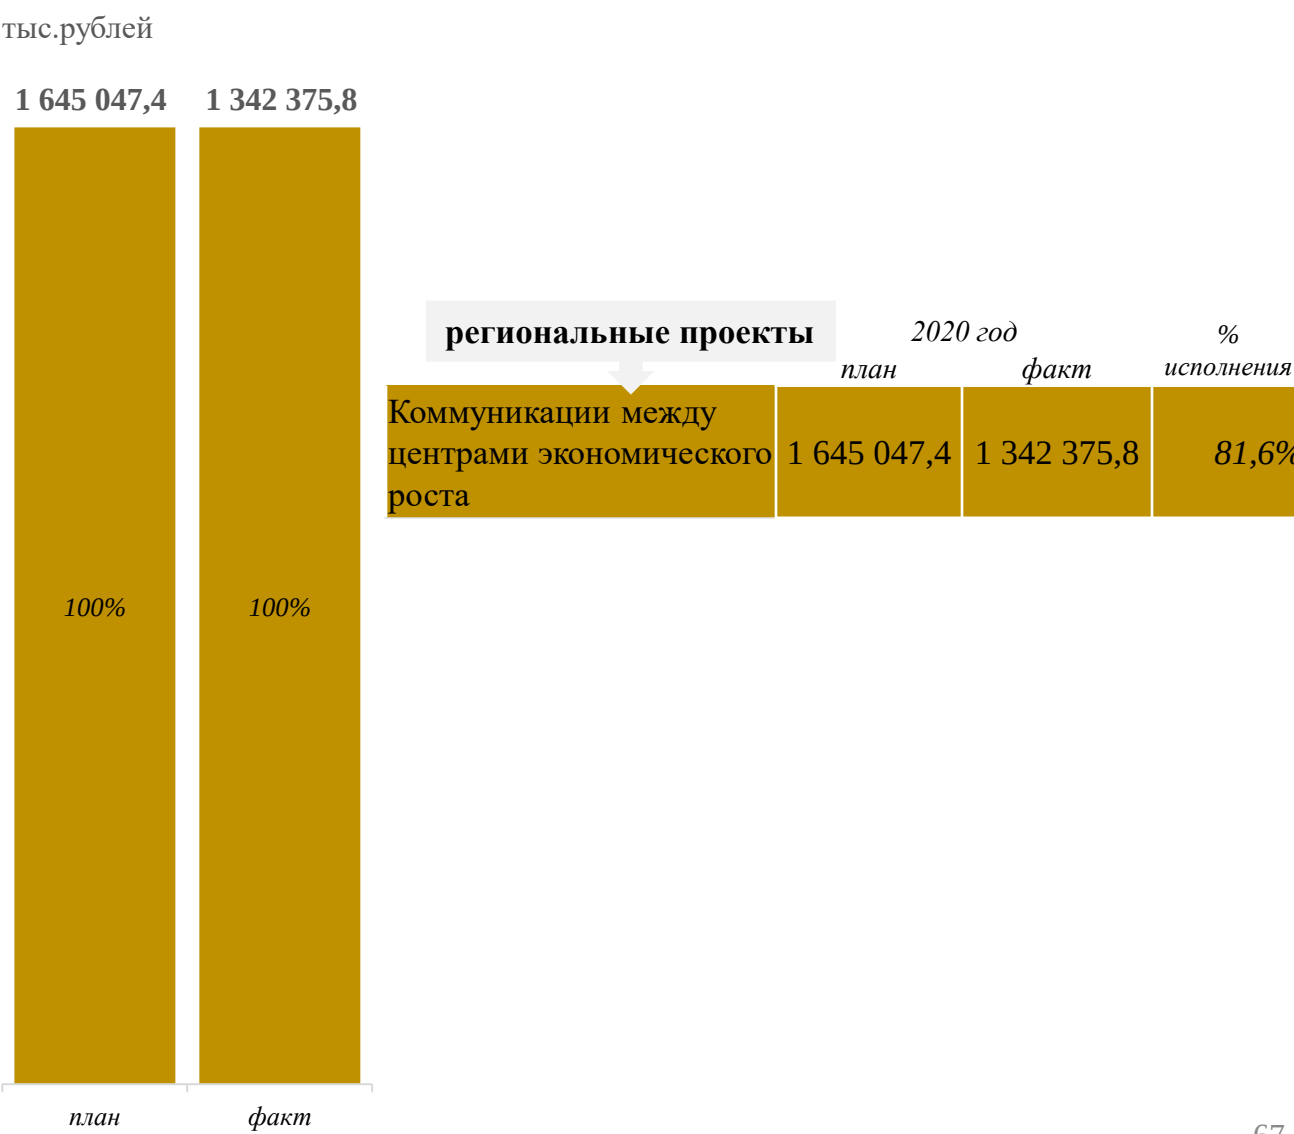

Региональный проект
Коммуникации между центрами экономического роста*

Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов РФ и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к Крымскому мосту, км*

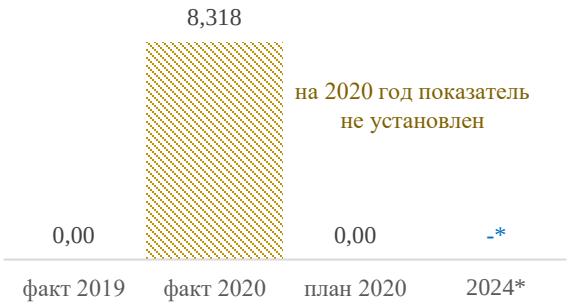

Количество построенных автодорожных обходов городов, шт.*



* - региональный проект по итогам 2020 года досрочно завершен
